BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE.
EMPRESA:	KRONUS SERVICOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.239.818/0001-71
CONTRATO:	20241113-01/SEINFRA
CONVÊNIO:	082/CIDADES/2024
MEDIÇÃO Nº:	1
PERÍODO:	18/11/2024 Á 16/12/2024
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	16/12/2024

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

VALOR CONTRATADO:	**R$ 1.564.553,03**
ADITIVO	**R$ -**
VALOR CONTRATADO + ADITIVO:	**R$ 1.564.553,03**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$ 109.262,23**
VALOR ACUMULADO	**R$ 109.262,23**
SALDO	**R$ 1.455.290,80**

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.0		**CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA CRAVATÁ 2**												
1.1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**R$ 28.970,00**							
1.1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	%	100,00	R$ 227,38	R$ 289,70	R$ 28.970,00	**4,70**	4,70	95,30	95%	R$ 1.361,59	R$ 1.361,59	27.608,4100
1.2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 2.580,24**							
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 168,76	R$ 215,02	R$ 2.580,24	**12,00**	12,00	-	0%	R$ 2.580,24	R$ 2.580,24	-
1.3		**LOCAÇÃO**					**R$ 3.738,00**							
1.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	600,00	R$ 0,27	R$ 0,34	R$ 204,00	**600,00**	600,00	-	0%	R$ 204,00	R$ 204,00	-
1.3.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	600,00	R$ 4,62	R$ 5,89	R$ 3.534,00	**600,00**	600,00	-	0%	R$ 3.534,00	R$ 3.534,00	-
1.4		**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 57.003,02**							
1.4.1		**NA PASSAGEM MOLHADA**												
1.4.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	480,00	R$ 48,92	R$ 62,33	R$ 29.918,40	**480,00**	480,00	-	0%	R$ 29.918,40	R$ 29.918,40	-
1.4.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	189,30	R$ 100,68	R$ 128,28	R$ 24.283,40		-	189,30	100%	R$ -	R$ -	24.283,4000
1.4.2		**NAS OMBREIRAS**												
1.4.2.1	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	M3	121,16	R$ 13,51	R$ 17,21	R$ 2.085,16		-	121,16	100%	R$ -	R$ -	2.085,1600
1.4.2.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	121,16	R$ 4,64	R$ 5,91	R$ 716,06		-	121,16	100%	R$ -	R$ -	716,0600
1.5		**ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA**					**R$ 679.193,30**							
1.5.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	743,04	R$ 543,37	R$ 692,31	R$ 514.414,02	**54,00**	54,00	689,04	93%	R$ 37.384,74	R$ 37.384,74	477.029,2800
1.5.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	200,00	R$ 75,41	R$ 96,08	R$ 19.216,00		-	200,00	100%	R$ -	R$ -	19.216,0000
1.5.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	90,00	R$ 527,67	R$ 672,30	R$ 60.507,00		-	90,00	100%	R$ -	R$ -	60.507,0000
1.5.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	90,00	R$ 159,08	R$ 202,68	R$ 18.241,20		-	90,00	100%	R$ -	R$ -	18.241,2000
1.5.5	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	600,00	R$ 23,52	R$ 29,97	R$ 17.982,00		-	600,00	100%	R$ -	R$ -	17.982,0000
1.5.6	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	30,00	R$ 382,36	R$ 487,16	R$ 14.614,80		-	30,00	100%	R$ -	R$ -	14.614,8000
1.5.7	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	100,00	R$ 187,53	R$ 238,93	R$ 23.893,00		-	100,00	100%	R$ -	R$ -	23.893,0000
1.5.8	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	42,00	R$ 192,95	R$ 245,84	R$ 10.325,28		-	42,00	100%	R$ -	R$ -	10.325,2800
2.0		**CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA CRAVATÁ 3**												
2.1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**R$ 28.970,00**							
2.1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	%	100,00	R$ 227,38	R$ 289,70	R$ 28.970,00	**2,15**	2,15	97,85	98%	R$ 622,86	R$ 622,86	28.347,1500

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE.
EMPRESA:	KRONUS SERVICOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.239.818/0001-71
CONTRATO:	20241113-01/SEINFRA
CONVÊNIO:	082/CIDADES/2024
MEDIÇÃO Nº:	1
PERÍODO:	18/11/2024 Á 16/12/2024
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	16/12/2024

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

VALOR CONTRATADO:	**R$ 1.564.553,03**
ADITIVO	**R$ -**
VALOR CONTRATADO + ADITIVO:	**R$ 1.564.553,03**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$ 109.262,23**
VALOR ACUMULADO	**R$ 109.262,23**
SALDO	**R$ 1.455.290,80**

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
2.2		**LOCAÇÃO**					**R$ 3.738,00**							
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	600,00	R$ 0,27	R$ 0,34	R$ 204,00	**600,00**	600,00	-	0%	R$ 204,00	R$ 204,00	-
2.2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	600,00	R$ 4,62	R$ 5,89	R$ 3.534,00	**600,00**	600,00	-	0%	R$ 3.534,00	R$ 3.534,00	-
2.3		**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 72.637,91**							
2.3.1		**NA PASSAGEM MOLHADA**												
2.3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	480,00	R$ 48,92	R$ 62,33	R$ 29.918,40	**480,00**	480,00	-	0%	R$ 29.918,40	R$ 29.918,40	-
2.3.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	215,70	R$ 100,68	R$ 128,28	R$ 27.670,00		-	215,70	100%	R$ -	R$ -	27.670,0000
2.3.2		**NAS OMBREIRAS**												
2.3.2.1	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	M3	650,93	R$ 13,51	R$ 17,21	R$ 11.202,51		-	650,93	100%	R$ -	R$ -	11.202,5100
2.3.2.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	650,93	R$ 4,64	R$ 5,91	R$ 3.847,00		-	650,93	100%	R$ -	R$ -	3.847,0000
2.4		**ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA**					**R$ 687.722,56**							
2.4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	755,36	R$ 543,37	R$ 692,31	R$ 522.943,28		-	755,36	100%	R$ -	R$ -	522.943,2800
2.4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	200,00	R$ 75,41	R$ 96,08	R$ 19.216,00		-	200,00	100%	R$ -	R$ -	19.216,0000
2.4.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	90,00	R$ 527,67	R$ 672,30	R$ 60.507,00		-	90,00	100%	R$ -	R$ -	60.507,0000
2.4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	90,00	R$ 159,08	R$ 202,68	R$ 18.241,20		-	90,00	100%	R$ -	R$ -	18.241,2000
2.4.5	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	600,00	R$ 23,52	R$ 29,97	R$ 17.982,00		-	600,00	100%	R$ -	R$ -	17.982,0000
2.4.6	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	30,00	R$ 382,36	R$ 487,16	R$ 14.614,80		-	30,00	100%	R$ -	R$ -	14.614,8000
2.4.7	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	100,00	R$ 187,53	R$ 238,93	R$ 23.893,00		-	100,00	100%	R$ -	R$ -	23.893,0000
2.4.8	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	42,00	R$ 192,95	R$ 245,84	R$ 10.325,28		-	42,00	100%	R$ -	R$ -	10.325,2800
						TOTAL GERAL COM C/BDI	**R$ 1.564.553,03**			**VALOR DA MEDIÇÃO**		**R$ 109.262,23**		
										VALOR ACUMULADA		**R$ 109.262,23**		
										SALDO		**R$ 1.455.290,80**		

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347111

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MEMORIAL DE CÁLCULO	
OBJETO:	**CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE.**
EMPRESA:	**KRONUS SERVICOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.239.818/0001-71**
CONTRATO:	**20241113-01/SEINFRA**
CONVÊNIO:	**082/CIDADES/2024**
MEDIÇÃO Nº:	**1**
PERÍODO:	**18/11/2024 Á 16/12/2024**
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	**16/12/2024**

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA CRAVATÁ 2								
1.1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						
1.1.1	**CP0001**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4,70	4,70	%
						Total	**4,70**	**%**
1.2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.2.1	**C1937**	**PLACAS PADRÃO DE OBRA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		PLACA PADRÃO	4,00	3,00		1,00	12,00	M2
						Total	**12,00**	**M2**
1.3		**LOCAÇÃO**						
1.3.1	**C2873**	**LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		LOCAÇÃO DA OBRA	100,00	6,00		1,00	600,00	M2
						Total	**600,00**	**M2**
1.3.2	**C2102**	**RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		LIMPEZA NA ÁREA DE INTERDIÇÃO	100,00	6,00		1,00	600,00	M2
						Total	**600,00**	**M2**
1.4		**MOVIMENTO DE TERRA**						
1.4.1		**NA PASSAGEM MOLHADA**						
1.4.1.1	**C2784**	**ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		DE ACORDO COM QUADRO DE CUBAÇÃO				480,00	480,00	M3
						Total	**480,00**	**M3**
1.5		**ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA**						
1.5.1	**C3345**	**ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		LAJÃO	8,00	6,00	0,30	1,00	14,40	M2
		PAREDES LONGITUDINAIS	6,00	1,00	1,10	6,00	39,60	M2
						Total	**54,00**	**M2**
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA CRAVATÁ 3								
2.1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						
2.1.1	**CP0001**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				2,15	2,15	%
						Total	**2,15**	**%**
2.2		**LOCAÇÃO**						
2.2.1	**C2873**	**LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		LOCAÇÃO DA OBRA	100,00	6,00		1,00	600,00	M2
						Total	**600,00**	**M2**
2.2.2	**C2102**	**RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		LIMPEZA NA ÁREA DE INTERDIÇÃO	100,00	6,00		1,00	600,00	M2
						Total	**600,00**	**M2**
2.3		**MOVIMENTO DE TERRA**						
2.3.1		**NA PASSAGEM MOLHADA**						
2.3.1.1	**C2784**	**ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		DE ACORDO COM QUADRO DE CUBAÇÃO				480,00	480,00	M3
						Total	**480,00**	**M3**

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO: 20241113-01/SEINFRA

Nº MEDIÇÃO: 01

PERÍODO MEDIÇÃO: 18/11/2024 Á 16/12/2024




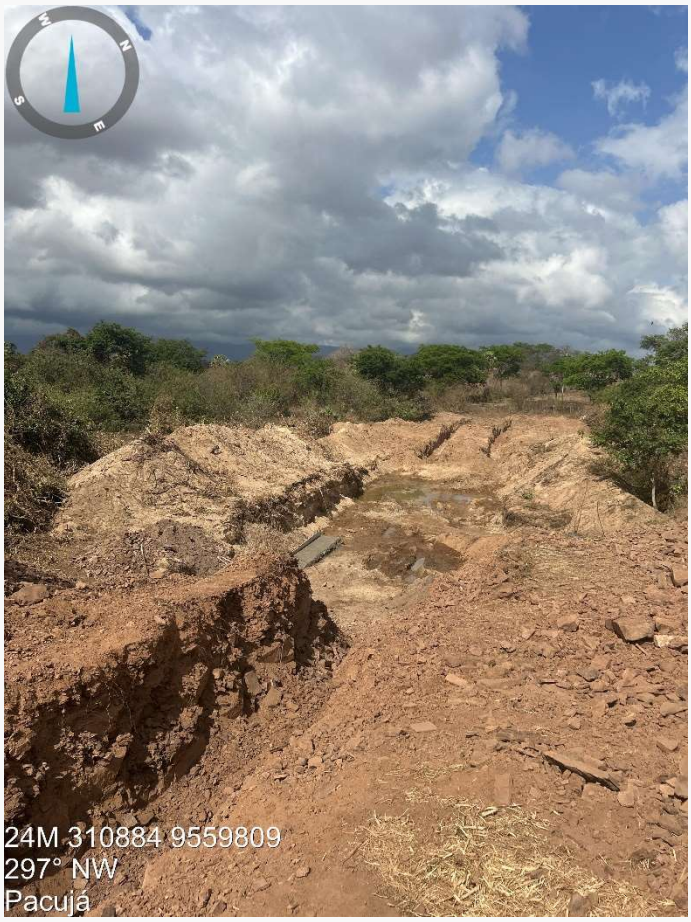


ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171



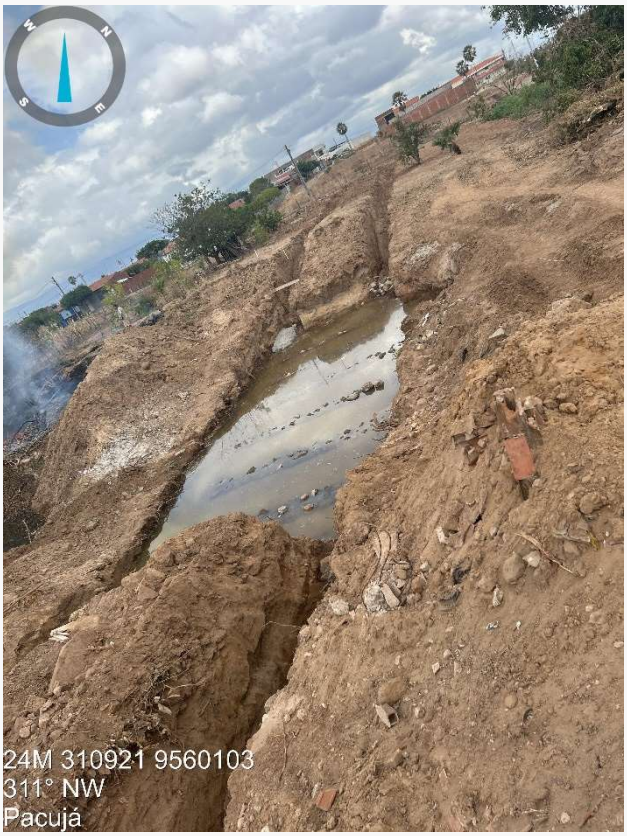

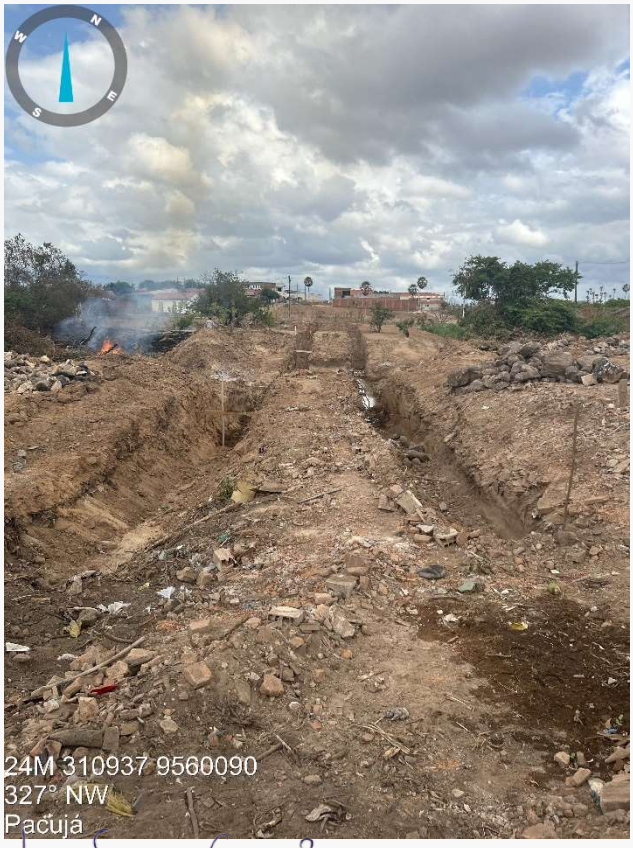



Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO









Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO







Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	18/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
LOCAÇÃO DA OBRA CRAVATÁ 2
LIMPEZA DE TERRENO CRAVATÁ 2
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	19/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
LOCAÇÃO DA OBRA CRAVATÁ 2
LIMPEZA DE TERRENO CRAVATÁ 2
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 2
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO FISCAL

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	20/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

OCORRÊNCIAS
FERIADO DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	21/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
LIMPEZA DE TERRENO CRAVATÁ 2
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 2
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO FISCAL

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	22/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
LIMPEZA DE TERRENO CRAVATÁ 2
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 2
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347111

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	23/11/2024 Á 24/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

OCORRÊNCIAS
FINAL DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO)

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	25/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 2
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (LAJÃO) CRAVATÁ 2
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	26/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 2
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (LAJÃO) CRAVATÁ 2
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	27/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (LAJÃO) CRAVATÁ 2
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO FISCAL

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	28/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (LAJÃO) CRAVATÁ 2
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	29/11/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (LAJÃO) CRAVATÁ 2
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	30/11/2024 Á 01/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (LAJÃO) CRAVATÁ 2
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	02/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (LAJÃO) CRAVATÁ 2
LOCAÇÃO DE OBRA CRAVATÁ 3
LIMPEZA DE TERRENO CRAVATÁ 3
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	03/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (PAREDES TRANSVERSAIS) CRAVATÁ 2
LIMPEZA DE TERRENO CRAVATÁ 3
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	04/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (PAREDES TRANSVERSAIS) CRAVATÁ 2
LIMPEZA DE TERRENO CRAVATÁ 3
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	05/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (PAREDES TRANSVERSAIS) CRAVATÁ 2
LIMPEZA DE TERRENO CRAVATÁ 3
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 3
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	06/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (PAREDES TRANSVERSAIS) CRAVATÁ 2
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 3
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	07/12/2024 Á 08/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

OCORRÊNCIAS
FINAL DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO)

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	09/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (PAREDES TRANSVERSAIS) CRAVATÁ 2
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 3
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	10/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (PAREDES TRANSVERSAIS) CRAVATÁ 2
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 3
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	11/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (PAREDES TRANSVERSAIS) CRAVATÁ 2
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 3
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	12/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (PAREDES TRANSVERSAIS) CRAVATÁ 2
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 3
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	13/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (PAREDES TRANSVERSAIS) CRAVATÁ 2
ESCAVAÇÃO DE TERRA CRAVATÁ 3
OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	14/12/2024 Á 15/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

OCORRÊNCIAS
FINAL DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO)

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.239.818/0001-71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE..	**TEMPO:**	BOM
DATA:	16/12/2024	**LOCAL:**	CRAVATÁ, MUNICÍPIO DE PACUJÁ

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (PAREDES TRANSVERSAIS) CRAVATÁ 2
INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

OCORRÊNCIAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347111

ENGENHEIRO FISCAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO ALVES VIEIRA
CPF
00412469340
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ENGENHEIRO DA CONSTRUTORA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241543378

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0619137410**
Registro: **347111CE**

Empresa contratada: **PROJECON PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**

Registro : **0000458139-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA**

CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**

RUA 22 DE SETEMBRO

Nº: **325**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PACUJÁ**

UF: **CE**

CEP: **62180000**

Contrato: **20241113 - 01/SEINFRA**

Celebrado em:

Valor: **R$ 1,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO CRAVATÁ 2 E CRAVATÁ 3

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA URBANA**

Cidade: **PACUJÁ**

UF: **CE**

CEP: **62180000**

Data de Início: **14/11/2024**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **-3.979621, -40.696568**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA**

CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.1 - DE CONCRETO	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS (CRAVATÁ 2 E CRAVATÁ 3), REFERENTES AO CONVÊNIO 082/CIDADES/2024 JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
Dados: 2024.11.27 11:15:56 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA - CPF: 068.252.443-37

PACUJÁ-CE (Local), 27 de NOVEMBRO (data) de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - CNPJ: 07.734.148/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **27/11/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8217481918**
