PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	23	**COMPETÊNCIA**	JUNHO/2022	**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**	20220000231000164490343929603 56
DATA E HORA DA EMISSÃO	08/06/2022 08:38:36	**NÚMERO DO RPS**	-	**LOCAL DA PRESTAÇÃO**	FORQUILHA - CE

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 5497

CPF/CNPJ: 41.546.961/0001-83

ENDEREÇO: 0 - RUA RENATO RODRIGUES DA MOTA, 24 - CENTRO - FORQUILHA-CE **MUNICÍPIO:** FORQUILHA **ESTADO:** CE

COMPLEMENTO: **TELEFONE:** - **E-MAIL:** ROBERTOSERVICON@HOTMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE PACUJÁ **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 3706

CPF/CNPJ: 07.734.148/0001-07

ENDEREÇO: RUA 22 DE SETEMBRO - 325 - CENTRO - 62180-000 **MUNICÍPIO:** PACUJÁ **ESTADO:** CE

COMPLEMENTO: **TELEFONE:** **E-MAIL:** PACUJAPREFEITURA@HOTMAIL.COM

SERVIÇO

7.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20220150, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

ATESTO
O recebimento dos Materiais/Serviços
Constantes do presente documentos
Nos termos da Lei nº 4.320/64

RAIMUNDO LUCIANO DE SOUSA
Secretaria de infraestrutura e urbanismo
042/ 2021

CNAE

-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)
–	–	–	–	–

VALORES DA NOTA FISCAL

VALOR DA NOTA (R$)	VALOR DEDUÇÕES (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R$)
133.327,84	–	133.327,84	2,00	2.666,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

REGIME DE TRIBUTAÇÃO	ISS RETIDO	OPTANTE DO SIMPLES
ME / EPP	Sim	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

				VALORES (R$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 21/05 A 07/06	ADITIVO	**(69.629,80)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**CNPJ: 41.546.961/0001-83**	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JUNHO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO Nº:**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**249.673,79**
		PERCENTUAL REALIZADO 14,66%		SALDO:	**1.453.657,06**
				VALOR DA MEDIÇÃO:	**133.327,84**

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.8.6	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	68,34	22,91	1.565,67	-	-	0,00	68,34	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.7	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	356,15	356,15	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.8	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	4,00	32,91	131,64	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
3.9	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					-	-						
3.9.1	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	45,86	45,86	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.2	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	1,00	41,68	41,68	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.3	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3")	UN	1,00	49,36	49,36	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.4	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	2,76	15,64	43,17	-	-	0,00	2,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.5	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,53	21,86	142,75	-	-	0,00	6,53	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	2,60	34,37	89,36	-	-	0,00	2,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.7	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	15,20	38,69	588,09	-	-	0,00	15,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.8	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	57,66	115,32	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.9	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	87,33	87,33	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.10	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	16,06	16,06								
3.9.11	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	3,00	19,47	58,41	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.12	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	6,00	14,88	89,28	-	-	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.13	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	3,00	17,30	51,90	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

11/11/22

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

				VALORES (R$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 21/05 A 07/06	ADITIVO	**(69.629,80)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**CNPJ: 41.546.961/0001-83**	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JUNHO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO Nº:**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**249.673,79**
		PERCENTUAL REALIZADO 14,66%		SALDO:	**1.453.657,06**
				VALOR DA MEDIÇÃO:	**133.327,84**

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.9.14	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	1,00	26,34	26,34	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.15	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	30,60	30,60	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.16	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00	33,18	66,36	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.17	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	4,00	25,34	101,36	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
3.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												
3.10.1	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	102,99	102,99	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	206,25	206,25	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	31,50	17,61	554,72	-	-	0,00	31,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.4	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	150,00	7,16	1.074,00	-	-	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.5	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	9,00	19,26	173,34	-	-	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	24,45	73,35	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	24,45	24,45	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.8	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	165,21	165,21	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.9	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	18,27	54,81	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	2,00	108,92	217,84	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	1,00	124,63	124,63	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
3.11	**LOUÇAS E METAIS**												

11/11/5

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 247111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**		
	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**CNPJ: 41.546.961/0001-83**	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 21/05 A 07/06
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JUNHO DE 2022	**ART DE FISCALIZAÇÃO Nº:**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		PERCENTUAL REALIZADO 14,66%	

VALORES (R$)	
CONTRATO:	1.772.960,65
ADITIVO	(69.629,80)
TOTAL:	1.703.330,85
MEDIÇÃO ACUMULADO:	249.673,79
SALDO:	1.453.657,06
VALOR DA MEDIÇÃO:	133.327,84

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATUAL UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	QUANTIDADE REALIZADA PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALORES (R$) PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.11.1	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	1.079,98	1.079,98	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,14	392,73	840,44	-	-	0,00	2,14	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	542,85	1.085,70	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	894,02	1.788,04	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.5	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	83,15	166,30	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.6	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	1,20	168,73	202,48	-	-	0,00	1,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.6	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/ WC'S	M	3,20	271,44	868,61	-	-	0,00	3,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.12	**PINTURAS**						-						
3.12.1	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,64	43,87	642,26	-	-	0,00	14,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.12.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,92	24,23	264,59	-	-	0,00	10,92	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.12.3	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	24,98	22,59	564,30	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
							-						
4.1	**PREPARAÇÃO DO TERRENO**					-	-						
4.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	371,55	4,47	1.660,83	-	-	0,00	371,55	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
4.2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						-						
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	371,55	62,51	23.225,59	-	-	0,00	371,55	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
4.3	**INSFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTRURA**						-						

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

				VALORES (R$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	Empresa Executante:	RECURSO:	MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA)	CONTRATO:	1.772.960,65
	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEC. DE INFRA	PERÍODO: 21/05 A 07/06	ADITIVO	(69.629,80)
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JUNHO DE 2022		TOTAL:	1.703.330,85
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	ART DE FISCALIZAÇÃO Nº:		MEDIÇÃO ACUMULADO:	249.673,79
		PERCENTUAL REALIZADO	14,66%	SALDO:	1.453.657,06
				VALOR DA MEDIÇÃO:	133.327,84

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.3.1	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,00	461,62	461,62	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.3.2	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	87,00	14,81	1.288,47	-	-	0,00	87,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4	**EMBASAMENTOS E BALDRAMES**					-	-						
4.4.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	56,70	642,11	36.407,64	-	-	0,00	56,70	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	66,40	43,28	2.873,79	-	-	0,00	66,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5	**PRODUÇÃO DE MATERIAIS**					-	-						
4.5.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	27,65	129,09	3.569,34	-	-	0,00	27,65	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6	**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**					-	-						
4.6.1	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	36,00	17,61	633,96	-	-	0,00	36,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	81,24	81,24	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.3	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	84,00	7,16	601,44	-	-	0,00	84,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	24,45	24,45	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.5	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	UN	2,00	1.849,71	3.699,42	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

11/VI/22

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA)**
	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 21/05 A 07/06
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**CNPJ: 41.546.961/0001-83**	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JUNHO DE 2022	
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO Nº:**	
		PERCENTUAL REALIZADO 14,66%	
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE			

VALORES (R$)	
CONTRATO:	**1.772.960,85**
ADITIVO	**(69.629,80)**
TOTAL:	**1.703.330,85**
MEDIÇÃO ACUMULADO:	**249.673,79**
SALDO:	**1.453.657,06**
VALOR DA MEDIÇÃO:	**133.327,84**

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATUAL UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	QUANTIDADE REALIZADA PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALORES (R$) PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
						-	-						
4.7	**REVESTIMENTO**												
4.7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	113,40	7,52	852,77	-	-	0,00	113,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	113,40	42,01	4.763,93	-	-	0,00	113,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
						-	-						
4.8	**PAREDES E PAINÉIS**												
4.8.1	ALAMBRADO C/ TELA DE ALUMÍNIO FIO ESP.=1.5 MM E MALHA DE (4X4)MM	M2	56,70	133,68	7.579,66	-	-	0,00	56,70	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
							-						
5.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
5.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	25,75	4,47	115,10	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	25,75	7,08	182,31	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	25,75	0,29	7,47	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
5.2	**MOVIMENTO DE TERRA**												
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	25,75	62,51	1.609,63	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
5.3	**EMBASAMENTOS E BALDRAMES**												
5.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	5,15	642,11	3.306,87	-	-	0,00	5,15	0,00%	0,00	0,00	0,00

11/11/5

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 21/05 A 07/06
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JUNHO DE 2022	
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO Nº:**	
		PERCENTUAL REALIZADO 14,66%	

VALORES (R$)	
CONTRATO:	1.772.960,65
ADITIVO	(69.629,80)
TOTAL:	1.703.330,85
MEDIÇÃO ACUMULADO:	249.673,79
SALDO:	1.453.657,06
VALOR DA MEDIÇÃO:	133.327,84

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
							-						
							-						
5.4	**INSFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTRURA**												
6.1	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	51,50	461,62	23.773,43	-	-	0,00	51,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	72,30	16,93	1.224,04	-	-	0,00	72,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
5.5	**ESTRUTURA METÁLICA**												
5.2	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 40m	M2	108,45	192,16	20.839,75	-	-	0,00	108,45	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E KG 12,50 =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	8.054,64	15,16	122.108,34	-	-	0,00	8054,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
5.6	**PINTURA**												
6.1	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	217,00	11,03	2.393,51	-	-	0,00	217,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
						-	-						
5.7	**SERVIÇOS FINAIS**												
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8,20	1,35	11,07	-	-	0,00	8,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL COM B.D.I 26,93%				1.703.330,85						133.327,84	116.345,95	249.673,79

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

1° MEDIÇÃO - MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	Empresa Executante: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	CNPJ: 41.546.961/0001-83 ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	

1.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	LARG	COMP				TOTAL
	DEMOLIÇAO DE CALÇADA EXISTENTE		1,2	500				600
1.1.5	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	COMP					TOTAL
	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO		800					800
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	COMP	LARG	PROF			TOTAL
	ESCAVAÇÃO PARA CONFECÇÃO DO MEIO FIO		600	0,15	0,2			18,00
1.3.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M2	COMP	LARG	PROF			TOTAL
	ALVENARIA DE PEDRA NA CALÇADA		90	0,4	0,8			28,80
`1.4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 05/2016	M2	LARG	COMP				TOTAL
	ATERRO NO TALUDE		1,35	213,34				288,00
.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	COMP	LADO				TOTAL
	MONTAGEM MEIO FIO		300	2				600
`1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	LARG	COMP				TOTAL
	CALÇADA EXECUTADA		1,5	105				157,5
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M2	LARG	COMP	ALT			TOTAL
	DEMOLIÇAO DO MURO DO ESTADIO		0,2	53,44	3,5			37,41
2.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M2	LARG	AREA	ALT			TOTAL
	ATERRO DA PRAÇA			1455,14	0,1			145,51
2.11.1	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	LARG	COMP				TOTAL
	DEMOLIÇAO DO MURO DO ESTADIO		3,2	44,77				143,27

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
GOVERNO PARTICIPATIVO E PARA TODOS

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 1

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:21/05/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO GOVERNO MAIS PERTO DO POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 2

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

DATA:23/05/2022 à 27/05/2022

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

2 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

4 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA

5 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

6 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

7 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

8

9

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
NOVO TEMPO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 3

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:30/05/2022 à 03/06/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

2 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

4 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

6 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

7 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA

8

9

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREAICE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

Fco. André Machado de Sousa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
GOVERNO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 4

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:06/06/2022 à 07/06/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

3 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

4 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

5 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171
ENGENHEIRO FISCAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA - 57447-D

PACUJÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE

PERIODO: 21/05/2022 a 07/06/2022

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

PACUJÁ

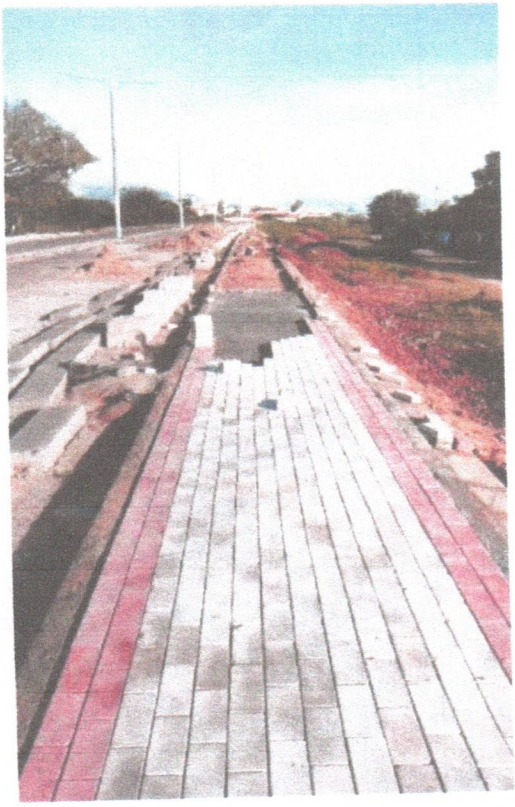










Luis Eduardo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

PACUJÁ

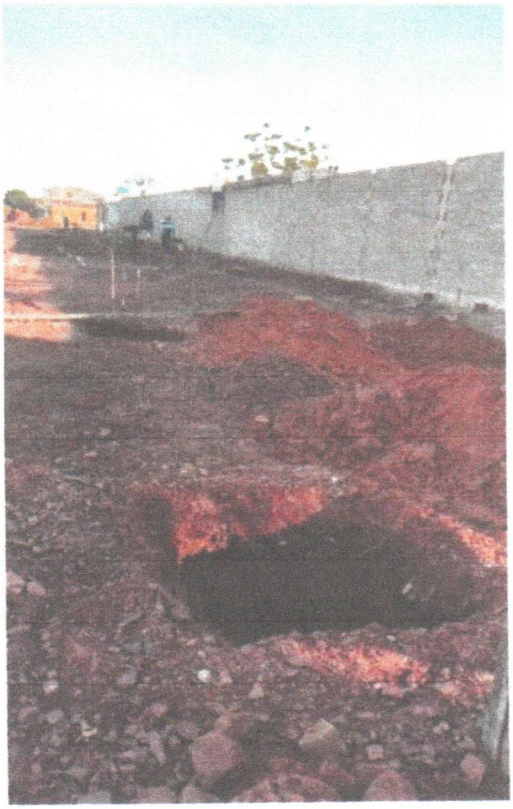

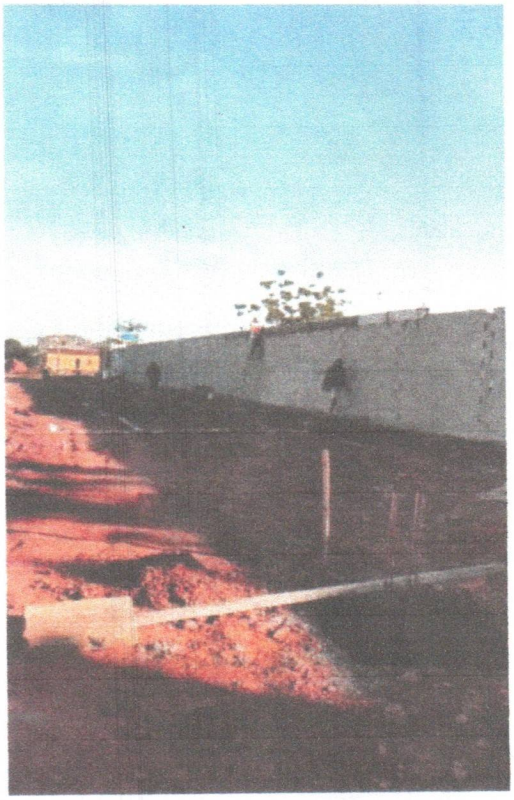

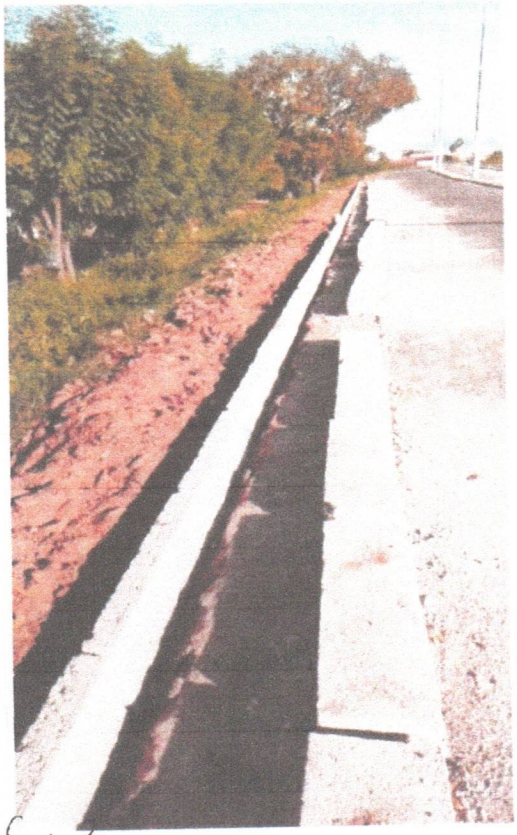



Luis Eduardo dos Santos Braga
Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

Pco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D





Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220986056

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0619137410**
Registro: **347111CE**

Empresa contratada: **PROJECON PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**
Registro : **0000458139-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA**
CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**
RUA 22 DE SETEMBRO
Nº: **325**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PACUJÁ**
UF: **CE**
CEP: **62180000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 1,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CORIOLANO DE BRITO
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **SEDE**
Cidade: **PACUJÁ**
UF: **CE**
CEP: **62180000**
Data de Início: **18/04/2022**
Previsão de término: **22/12/2022**
Coordenadas Geográficas: **-3.976850, -40.703968**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA**
CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	5.335,78	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PARA RECEBER BRINQUEDOPRAÇA E ACADEMIA AO AR LIVRE E REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AV. CORIOLANO DE BRITO NA SEDE DE PACUJÁ/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA - CPF: 068.252.443-37

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - CNPJ: 07.734.148/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **17/05/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8215400190**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220972743

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO ANDRÉ MACHADO DE SOUSA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0614841046**
Registro: **57447CE**

Empresa contratada: **SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**
Registro : **0010469230-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**
CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**
RUA RUA 22 DE SETEMBRO
Nº: **325**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PACUJÁ**
UF: **CE**
CEP: **62180000**

Contrato: **20220150**
Celebrado em: **18/04/2022**
Valor: **R$ 1.772.960,65**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AVENIDA QUE DA ACESSO A GRACA E MUCAMBO
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **PACUJÁ**
UF: **CE**
CEP: **62180000**
Data de Início: **19/04/2022**
Previsão de término: **18/11/2022**
Coordenadas Geográficas: **-3.980765, -40.696542**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**
CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução 49 - Execução de obra > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO ANDRÉ MACHADO DE SOUSA - CPF: 026.349.893-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CNPJ: 07.734.148/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **29/04/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8215341024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: dwd5B
Impresso em: 30/04/2022 às 10:30:53 por: , ip: 177.37.177.113

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.010.79523/74

Nome da obra
SOMETAL SERVICOS - URBANIZACAO DA AVENIDA DE ACESSO A GRACA E MUCAMBO

Data do cadastramento
24/05/2022 13:37

Origem do cadastramento
e-CAC

ART **RRT** **CIB** **Cadastro Imobiliário**

Data do início da obra
19/04/2022

CNAE
4399103 Obras de alvenaria

Situação da obra

Situação
Ativa

Data
19/04/2022

Endereço

País
BRASIL

Município
PACUJA

UF
CE

CEP
62.180-000

Bairro
DIVERSOS

Logradouro
RUA AVENIDA QUE DA ACESSO A GRACA E MUCAMBO

Número
SN

Responsável

Nome
SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CPF/CNPJ
41.546.961/0001-83

Vínculo
Construtora

Data de início da responsabilidade
19/04/2022

Data de término da responsabilidade

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.734.148/0001-07	MUNICIPIO DE PACUJA

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial unifamiliar	Alvenaria	1,00 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
1,00 m²
