PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	29	**COMPETÊNCIA**	AGOSTO/2022	**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**	20220000291000164129633229809O7
DATA E HORA DA EMISSÃO	29/08/2022 08:58:15	**NÚMERO DO RPS**	-	**LOCAL DA PRESTAÇÃO**	FORQUILHA - CE

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 5497
CPF/CNPJ: 41.546.961/0001-83
ENDEREÇO: 0 - RUA RENATO RODRIGUES DA MOTA, 24 - CENTRO - FORQUILHA-CE **MUNICÍPIO:** FORQUILHA **ESTADO:** CE
COMPLEMENTO: **TELEFONE:** - **E-MAIL:** ROBERTOSERVICON@HOTMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE PACUJÁ **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 3706
CPF/CNPJ: 07.734.148/0001-07
ENDEREÇO: RUA 22 DE SETEMBRO - 325 - CENTRO - 62180-000 **MUNICÍPIO:** PACUJÁ **ESTADO:** CE
COMPLEMENTO: **TELEFONE:** **E-MAIL:** PACUJAPREFEITURA@HOTMAIL.COM

SERVIÇO

7.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº: 2022150, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

ATESTO
O recebimento dos Materiais/Servicos
Constantes do presente documentos
Nos termos da Lei nº 4.320/64

RAIMUNDO LUCIANO DE SOUSA
Secretaria de infraestrutura e urbanismo
042/ 2021

CNAE

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)
--	--	--	--	--

VALORES DA NOTA FISCAL

VALOR DA NOTA (R$)	VALOR DEDUÇÕES (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R$)
73.195,75	--	73.195,75	2,00	1.463,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

REGIME DE TRIBUTAÇÃO	ISS RETIDO	OPTANTE DO SIMPLES
ME / EPP	Sim	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	RECURSO:	MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)	CONTRATO:	1.772.960,65
		SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	(69.629,81)
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	1.703.330,85
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	ART DE FISCALIZAÇÃO I		MEDIÇÃO ACUMULADO:	414.184,24
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	1.289.146,60
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	73.195,75

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1.0	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA												
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,85	10,60	539,01	-	-	0,00	50,85	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	334,02	8,94	2.986,14	-	-	0,00	334,02	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	240,08	16,41	3.939,71	-	-	0,00	240,08	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.194,21	26,33	31.443,55	-	950,00	950,00	244,21	79,55%	0,00	25.013,50	25.013,50
1.1.5	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	800,26	10,72	8.578,79	-	800,26	800,26	0,00	100,00%	0,00	8.578,79	8.578,79
							-						
1.2	ESCAVAÇÃO						-						
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	41,04	52,33	2.147,62	-	24,75	24,75	16,29	60,31%	0,00	1.295,17	1.295,17
1.2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	41,00	8,83	362,03	-	-	0,00	41,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
1.3	CONTENÇÕES						-						
1.3.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	68,40	492,74	33.703,42	10,80	57,60	68,40	0,00	100,00%	5.321,60	28.381,82	33.703,42
							-						
1.4	MOVIMENTO DE TERRA / TRANSPORTE DE ENTULHO				-		-						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM		**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743**	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1.4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	912,00	43,18	39.380,16	279,75	632,25	912,00	0,00	100,00%	12.079,60	27.300,56	39.380,16
1.4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	470,11	7,69	3.615,15	-	288,00	288,00	182,11	61,26%	0,00	2.214,72	2.214,72
							-						
1.5	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**						-						
1.5.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	4,00	1.040,10	4.160,40	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.5.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	2.049,97	8.199,88	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.5.3	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	1,00	1.725,16	1.725,16	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.5.4	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	150,00	623,66	93.549,00	-	-	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.5.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.906,78	26,71	104.350,09	580,00	1.050,00	1.630,00	2276,78	41,72%	15.491,80	28.045,50	43.537,30
							-						
1.6	**PAVIMENTAÇÃO**						-						
1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.596,89	64,49	296.453,44	390,00	787,50	1.177,50	3419,39	25,62%	25.151,10	50.785,88	75.936,98
							-						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	**SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT R$**	**P.TOTAL R$**	**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**	**SALDO**	**PERC. %**	**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**
1.7	**URBANIZAÇÃO**						-						
1.7.1	POSTE COLONIAL EM ALUMINIO FUNDIDO TAM. 3.94M COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO	UN	10,00	5.091,16	50.911,60	-	-	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.7.2	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	11,00	1.122,61	12.348,71	-	-	0,00	11,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.7.3	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8,00	348,94	2.791,52	-	-	0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
1.8	**INSTALAÇÃO ELÉTRICAS**						-						
1.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.247,47	7,67	24.908,09	-	-	0,00	3247,47	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	1.082,49	9,28	10.045,51	250,00	-	250,00	832,49	23,09%	2.320,00	0,00	2.320,00
1.8.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	46,00	187,50	8.625,00	10,00	-	10,00	36,00	21,74%	1.875,00	0,00	1.875,00
1.8.4	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	2,00	2.924,12	5.848,24	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.8.5	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W INCLUSIVE O POSTE	UN	34,00	2608,03	88.673,02	-	-	0,00	34,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
1.9	**PINTURA**						-						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	RECURSO:	MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)	CONTRATO:	1.772.960,65
		SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	(69.629,81)
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	1.703.330,85
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	ART DE FISCALIZAÇÃO I		MEDIÇÃO ACUMULADO:	414.184,24
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	1.289.146,60
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	73.195,75

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1.9.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	622,36	19,66	12.235,60	-	-	0,00	622,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
1.10	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**						-						
1.10.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	16,80	467,69	7.857,19	-	-	0,00	16,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
1.11	**MOVIMENTO DE TERRA / TRANSPORTE DE ENTULHO**				-		-						
1.11.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.728,00	1,35	2.332,80	-	-	0,00	1728,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.0	**CONSTRUÇÃO PRAÇA**												
							-						
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						-						
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	62,70	60,75	3.809,03	-	62,70	62,70	0,00	100,00%	0,00	3.809,03	3.809,03
2.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.738,35	0,29	504,12	-	1.738,35	1.738,35	0,00	100,00%	0,00	504,12	504,12
							-						
2.2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						-						
2.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	291,03	111,55	32.464,40	-	291,03	291,03	0,00	100,00%	0,00	32.464,40	32.464,40
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	18,00	52,33	941,94	18,00	-	18,00	0,00	100,00%	941,94	0,00	941,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	25,29	25,46	643,88	25,29	-	25,29	0,00	100,00%	643,88	0,00	643,88
2.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	25,29	28,91	731,13	25,29	-	25,29	0,00	100,00%	731,13	0,00	731,13
							-						
2.3	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS (ARQUIBANCADA)**						-						
2.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	11,12	642,11	7.140,26	-	-	0,00	11,12	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.3.2	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	23,00	499,47	11.487,81	-	-	0,00	23,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.3.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	85,68	44,30	3.795,62	-	-	0,00	85,68	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.4	**PISOS**				-		-						
2.4.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,06	616,22	3.118,07	-	-	0,00	5,06	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	246,15	24,66	6.070,06	-	-	0,00	246,15	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.3	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	92,18	153,57	14.156,08	-	-	0,00	92,18	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.4	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	52,76	153,57	8.102,35	-	-	0,00	52,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	496,35	27,87	13.833,27	310,00	-	310,00	186,35	62,46%	8.639,70	0,00	8.639,70
2.4.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	680,45	48,73	33.158,33	-	-	0,00	680,45	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.7	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	62,76	133,48	8.377,20	-	-	0,00	62,76	0,00%	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT	P.TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC.	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
				R$	R$					%			
							-						
2.5	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**						-						
2.5.1	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	176,28	176,28	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.5.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	50,00	22,91	1.145,50	-	-	0,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.5.3	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	3,00	32,91	98,73	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	-						
2.6.1	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	102,99	102,99	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	302,70	302,70	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.3	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	120,20	360,60	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.4	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	12,00	183,99	2.207,88	-	-	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.5	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	83,85	17,61	1.476,60	-	-	0,00	83,85	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.6	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	50,00	26,68	1.334,00	-	-	0,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.7	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	60,00	47,61	2.856,60	-	-	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.8	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	100,00	7,16	716,00	-	-	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.9	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	500,00	8,73	4.365,00	-	-	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.10	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	60,00	9,63	577,80	-	-	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	24,45	97,80	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO: **MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022	TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO !**	MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%	SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE			VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	24,45	24,45	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.13	LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	15,00	73,89	1.108,35	-	-	0,00	15,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.14	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	20,00	219,40	4.388,00	-	-	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.15	POSTE COLONIAL EM ALUMINIO FUNDIDO TAM. 3.94M COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO	UN	7,00	5.091,16	35.638,12	-	-	0,00	7,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.16	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO QUADRUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	3.342,00	16.710,00	-	-	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.17	LÂMPADA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 200 W	UN	20,00	599,07	11.981,40	-	-	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.7	**CARAMCHÃO**						-						
2.7.1	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,60	461,62	276,97	-	-	0,00	0,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.7.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	10,08	16,93	170,65	-	-	0,00	10,08	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.7.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	5,04	14,81	74,64	-	-	0,00	5,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.7.4	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	45,60	121,41	5.536,30	-	-	0,00	45,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.7.5	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	60,00	69,90	4.194,00	-	-	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.7.6	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	63,48	25,53	1.620,64	-	-	0,00	63,48	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.8	**URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO**						-						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO: **MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022	TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**	MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%	SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE			VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.8.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	12,00	1.122,61	13.471,32	-	-	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.8.2	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	6,00	348,94	2.093,64	-	-	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.8.3	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	174,07	14,77	2.571,01	-	-	0,00	174,07	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.9	**PINTURAS**						-						
2.9.1	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE. COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	M2	291,73	96,54	28.163,61	-	-	0,00	291,73	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.9.2	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA	M2	291,73	37,00	10.794,01	-	-	0,00	291,73	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.9.3	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	101,91	27,05	2.756,67	-	-	0,00	101,91	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.10	**BASE PARA COLOCAÇÃO DO NOME PACUJA**				-		-						
2.10.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	18,88	123,22	2.326,39	-	-	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	18,88	7,20	135,94	-	-	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	18,88	38,05	718,38	-	-	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.4	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	36,40	153,57	5.589,95	-	-	0,00	36,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.5	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	18,88	24,29	458,60	-	-	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.6	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	18,88	18,89	356,64	-	-	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.10.7	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	M2	18,35	72,29	1.326,52	-	-	0,00	18,35	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.8	LETRAS TAM. 1,5m COM ESTRUTURA EM CHAPA FERROCOM PINTURA AUTOMOTIVA CONFORME LAYOUT APRESENTADO, BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO LETRAS COM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LEDS DINÂMICOS E FRENTE EM ACRÍLICO COLORIDO COM INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO	UN	1,00	49.185,38	49.185,38	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.11	**SERVIÇOS DIVERSOS**						-						
2.11.1	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	444,13	298,55	132.595,01	-	444,13	444,13	0,00	100,00%	0,00	132.595,01	132.595,01
2.11.2	REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES	M2	169,67	2,86	485,26	-	-	0,00	169,67	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.11.3	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.738,35	1,35	2.346,77	-	-	0,00	1738,35	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.0	**QUIOSQUE**												
							-						
3.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						-						
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	6,32	62,51	395,06	-	-	0,00	6,32	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.2	**INSFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTRURA**						-						
3.2.1	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,50	461,62	230,81	-	-	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2.2	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,64	841,69	538,68	-	-	0,00	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,55	16,93	703,44	-	-	0,00	41,55	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2.4	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	10,20	14,81	151,06	-	-	0,00	10,20	0,00%	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO: **MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	**SEC. DE INFRA** PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022	TOTAL:	**1.703.330,85**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		**ART DE FISCALIZAÇÃO I**	MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%	SALDO:	**1.289.146,60**
			VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.2.5	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	4,51	137,88	621,84	-	-	0,00	4,51	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2.6	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	29,16	130,27	3.798,67	-	-	0,00	29,16	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.3	**ALVENARIA**						-						
3.3.1	ALVENARIA DE TIJOLO REFRATÁRIO 1/2 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	63,05	335,13	21.129,95	-	-	0,00	63,05	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,10	1.972,89	197,29	-	-	0,00	0,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.4	**COBERTURA**						-						
3.4.1	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	51,84	104,64	5.424,54	-	-	0,00	51,84	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.4.2	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	M2	51,84	113,26	5.871,40	-	-	0,00	51,84	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.4.3	CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM"	M	20,36	29,21	594,72	-	-	0,00	20,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.4.4	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	28,80	31,53	908,06	-	-	0,00	28,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.5	**ESQUADRIAS**				-		-						
3.5.1	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m	UN	2,00	986,21	1.972,42	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.5.2	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	902,66	902,66	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.5.3	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	7,32	391,40	2.865,05	-	-	0,00	7,32	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.5.4	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	0,40	348,36	139,34	-	-	0,00	0,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO: **SEC. DE INFRA**	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)** PERÍODO: 08/07 A 26/08	CONTRATO:	**1.772.960,65**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		ADITIVO	**(69.629,81)**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO !**		TOTAL:	**1.703.330,85**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
				SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.6	**REVESTIMENTOS**						-						
3.6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	57,83	7,20	416,38	-	-	0,00	57,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	57,83	37,13	2.147,23	-	-	0,00	57,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	57,83	121,41	7.021,14	-	-	0,00	57,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	57,83	9,08	525,10	-	-	0,00	57,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.5	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	24,98	14,05	350,97	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.6	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	24,98	37,99	948,99	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
3.7	**PISOS**					-	-						
3.7.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,46	616,22	899,68	-	-	0,00	1,46	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.7.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	24,98	24,66	616,01	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.7.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	24,98	125,42	3.132,99	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.7.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	24,98	9,08	226,82	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**		VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO: **MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022	TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**	MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%	SALDO:	**1.289.146,60**
			VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	**SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT R$**	**P.TOTAL R$**	**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**	**SALDO**	**PERC. %**	**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**
							-						
3.8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						-						
3.8.1	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	4,00	12,24	48,96	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.2	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UN	6,00	14,06	84,36	-	-	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.3	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	1,00	109,81	109,81	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.4	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	9,00	8,82	79,38	-	-	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.5	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	5,00	9,98	49,90	-	-	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.6	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	68,34	22,91	1.565,67	-	-	0,00	68,34	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.7	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	356,15	356,15	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.8	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	4,00	32,91	131,64	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
3.9	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					-	-						
3.9.1	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	45,86	45,86	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.2	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	1,00	41,68	41,68	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.3	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3")	UN	1,00	49,36	49,36	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.4	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	2,76	15,64	43,17	-	-	0,00	2,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.5	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,53	21,86	142,75	-	-	0,00	6,53	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	2,60	34,37	89,36	-	-	0,00	2,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.7	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	15,20	38,69	588,09	-	-	0,00	15,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.8	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	57,66	115,32	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.9.9	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	87,33	87,33	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.10	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	16,06	16,06	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.11	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	3,00	19,47	58,41	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.12	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	6,00	14,88	89,28	-	-	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.13	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	3,00	17,30	51,90	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.14	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	1,00	26,34	26,34	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.15	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	30,60	30,60	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.16	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00	33,18	66,36	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.17	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	4,00	25,34	101,36	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						-						
3.10.1	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	102,99	102,99	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	206,25	206,25	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	31,50	17,61	554,72	-	-	0,00	31,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.4	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	150,00	7,16	1.074,00	-	-	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.5	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	9,00	19,26	173,34	-	-	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	24,45	73,35	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.10.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	24,45	24,45	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.8	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	165,21	165,21	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.9	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	18,27	54,81	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	2,00	108,92	217,84	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	1,00	124,63	124,63	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
3.11	**LOUÇAS E METAIS**					-	-						
3.11.1	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	1.079,98	1.079,98	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,14	392,73	840,44	-	-	0,00	2,14	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	542,85	1.085,70	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	894,02	1.788,04	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.5	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	83,15	166,30	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.6	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	1,20	168,73	202,48	-	-	0,00	1,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.8	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,20	271,44	868,61	-	-	0,00	3,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.12	**PINTURAS**						-						
3.12.1	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,64	43,87	642,26	-	-	0,00	14,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.12.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,92	24,23	264,59	-	-	0,00	10,92	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.12.3	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	24,98	22,59	564,30	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
							-						
4.0	**QUADRA DE VOLEI**												
							-						
4.1	**PREPARAÇÃO DO TERRENO**					-	-						
4.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	371,55	4,47	1.660,83	-	-	0,00	371,55	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
4.2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						-						
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	371,55	62,51	23.225,59	-	-	0,00	371,55	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
4.3	**INSFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTRURA**						-						
4.3.1	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,00	461,62	461,62	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.3.2	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	87,00	14,81	1.288,47	-	-	0,00	87,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
4.4	**EMBASAMENTOS E BALDRAMES**					-	-						
4.4.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	56,70	642,11	36.407,64	-	-	0,00	56,70	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	66,40	43,28	2.873,79	-	-	0,00	66,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
4.5	**PRODUÇÃO DE MATERIAIS**						-						
4.5.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	27,65	129,09	3.569,34	-	-	0,00	27,65	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
4.6	**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**					-	-						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO: **MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022	TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**	MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%	SALDO:	**1.289.146,60**
			VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.6.1	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	36,00	17,61	633,96	-	-	0,00	36,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	81,24	81,24	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.3	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	84,00	7,16	601,44	-	-	0,00	84,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	24,45	24,45	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.5	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	UN	2,00	1.849,71	3.699,42	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
4.7	**REVESTIMENTO**					-	-						
4.7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	113,40	7,52	852,77	-	-	0,00	113,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	113,40	42,01	4.763,93	-	-	0,00	113,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
4.8	**PAREDES E PAINÉIS**					-	-						
4.8.1	ALAMBRADO C/ TELA DE ALUMÍNIO FIO ESP.=1.5 MM E MALHA DE (4X4)MM	M2	56,70	133,68	7.579,66	-	-	0,00	56,70	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
5.0	**CONSTRUÇÃO DOS ARCOS**												
							-						
5.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						-						
5.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	25,75	4,47	115,10	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	25,75	7,08	182,31	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO: **SEC. DE INFRA**	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)** PERÍODO: 08/07 A 26/08	CONTRATO:	**1.772.960,65**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		ADITIVO	**(69.629,81)**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		TOTAL:	**1.703.330,85**
		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
				SALDO:	**1.289.146,60**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.1.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	25,75	0,29	7,47	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
5.2	**MOVIMENTO DE TERRA**						-						
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	25,75	62,51	1.609,63	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
5.3	**EMBASAMENTOS E BALDRAMES**						-						
5.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	5,15	642,11	3.306,87	-	-	0,00	5,15	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
5.4	**INSFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTRURA**						-						
6.1	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	51,50	461,62	23.773,43	-	-	0,00	51,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	72,30	16,93	1.224,04	-	-	0,00	72,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
5.5	**ESTRUTURA METÁLICA**						-						
5.2	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 40m	M2	108,45	192,16	20.839,75	-	-	0,00	108,45	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E KG 12,50 =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	8.054,64	15,16	122.108,34	-	-	0,00	8054,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
5.6	**PINTURA**						-						
6.1	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	217,00	11,03	2.393,51	-	-	0,00	217,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
5.7	**SERVIÇOS FINAIS**					-	-						
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8,20	1,35	11,07	-	-	0,00	8,20	0,00%	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 4ª (QUARTA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
		SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/07 A 26/08	ADITIVO	**(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 26 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**414.184,24**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		PERCENTUAL REALIZADO 24,32%		SALDO:	**1.289.146,60**
				VALOR DA MEDIÇÃO:	**73.195,75**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
				R$	R$								
	TOTAL GERAL COM B.D.I 26,93%				1.703.330,84						73.195,75	340.988,49	414.184,24

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

4° MEDIÇÃO - MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	Empresa Executante:
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDAD DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 41.546.981/0001-83 ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	

1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	COMP	LARG	PROF		TOTAL
	ESCAVAÇÃO PARA CONFECÇÃO DO MEIO FIO		225	0,15	0,2		6,75
1.3.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M2	COMP	LARG	PROF		TOTAL
	ALVENARIA DE PEDRA NA CALÇADA		33,75	0,4	0,8		10,80
`1.4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M2	LARG	COMP			TOTAL
	ATERRO NO TALUDE		1,35	207,23			279,75
`1.4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M2	LARG	COMP	ESP		TOTAL
	CARGA DE ENTULHO DAS CALÇADAS		1,2	607,00	0,25		182,11
1.1.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	COMP	LADO			TOTAL
	MONTAGEM MEIO FIO		290	2			580,00
`1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	LARG	COMP			TOTAL
	CALÇADA EXECUTADA		1,5	10			15,00
	CALÇADA ACESSO RUAS		3	125			375,00
1.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M					TOTAL
	ELETRODUTO LIGAÇÃO DOS POSTES	250					250,00
1.8.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND					TOTAL
	CAIXA DOS POSTES DO CANTEIRO	10					10,00
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	PERM	COMP	LARG		TOTAL
	VALA DRENAGEM		150	0,3	0,4		18,00
2.2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M2	PERN	LARG	ALT		TOTAL
			67,45	0,15	2,5		25,29
2.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M2	PERN	LARG	ALT		TOTAL
	MEIO FIO PRAÇA E CANTEIRO		67,45	0,15	2,5		25,29
2.4.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	COMP				TOTAL
	MONTAGEM MEIO FIO PRAÇA		310				310,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220986056

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0619137410**
Registro: **347111CE**

Empresa contratada: **PROJECON PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**

Registro : **0000458139-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA**
RUA 22 DE SETEMBRO
Complemento:
Cidade: **PACUJÁ**

CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**
Nº: **325**
Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**
CEP: **62180000**

Contrato: **Não especificado**
Valor: **R$ 1,00**
Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CORIOLANO DE BRITO
Complemento:
Cidade: **PACUJÁ**
Data de Início: **18/04/2022**
Previsão de término: **22/12/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA**

Nº: **S/N**
Bairro: **SEDE**
UF: **CE**
CEP: **62180000**
Coordenadas Geográficas: **-3.976850, -40.703968**
Código: **Não Especificado**
CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	5.335,78	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PARA RECEBER BRINQUEDOPRAÇA E ACADEMIA AO AR LIVRE E REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AV. CORIOLANO DE BRITO NA SEDE DE PACUJÁ/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luis Eduardo dos Santos Braga

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA - CPF: 068.252.443-37

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - CNPJ: 07.734.148/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **17/05/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8215400190**

PACUJÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DA AVENIDA CORIOLANO ALVES DE BRITO

PERÍODO:08/06/22 A 26/08/22

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

Francisco Andre Machado de Sousa
...chado de Sousa
...o Civil
CREA: 57447-D

AGOSTO DE 2022





Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

PACUJÁ



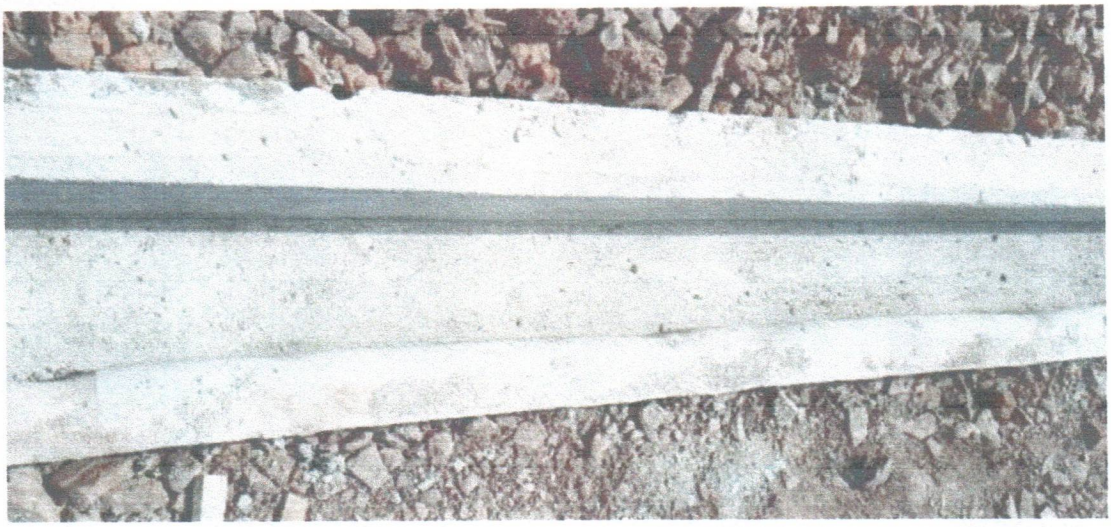

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D





Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 34711

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D



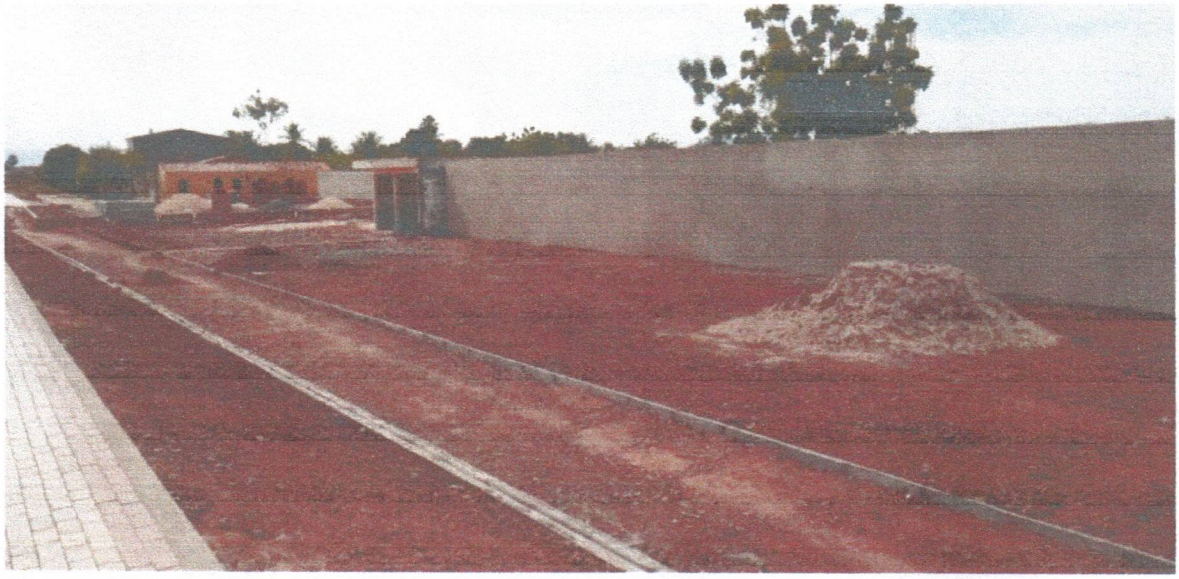

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D





Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 1

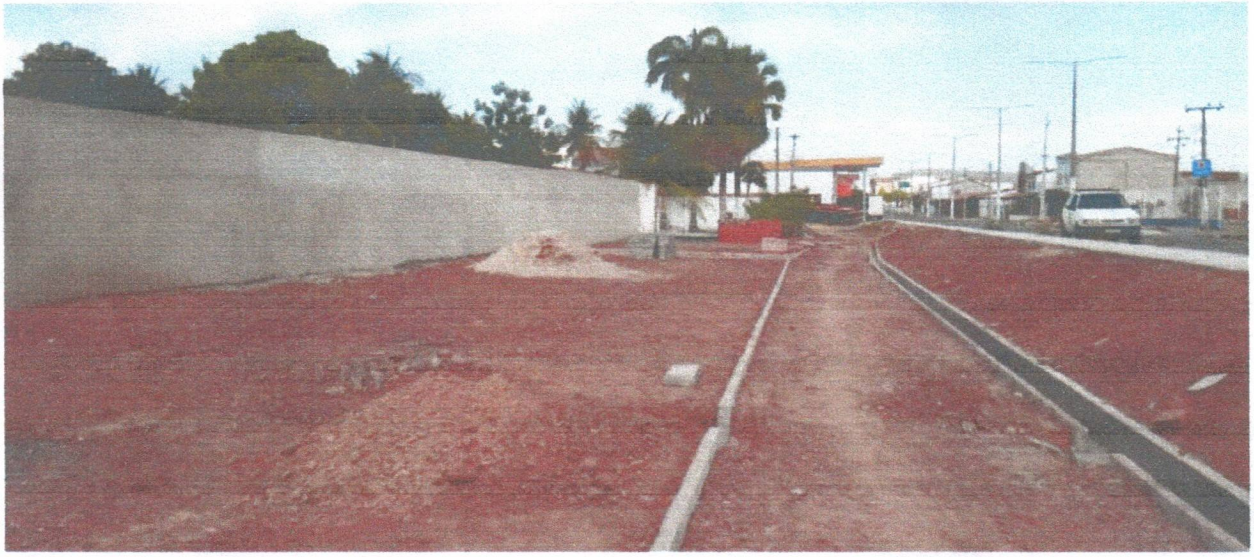OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:08/07/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

2 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

3

4

6

7

8

9

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 2

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:11/07/2021 à 15/07/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

2 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 3

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:18/07/2021 à 22/07/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

2 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10

4 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

5

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 4

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:25/07/2021 à 29/07/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

4 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

5

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 5

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:01/08/2022 à 05/08/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Francisco André Machado de Sousa

Eng. André Machado de Sousa

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 6

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:08/08/2022 à 12/08/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 7

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:15/08/2022 à 19/08/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

3 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

4

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Engenheiro Civil
CREA: 57447-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 8

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

DATA:22/08/2022 à 26/08/2022

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

TAREFAS REALIZADAS

1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

3

4

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

ENGENHEIRO FISCAL
