ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº 0000000018

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/09/2024	Competência	SET/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PACUJÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA								
Nome Fantasia	LOCMAQ SERVICOS								
Endereço	RUA CORONEL JOSÉ LIBÂNIO, 431 - CENTRO								
CPF/CNPJ	39.965.225/0001-18	Insc.Municipal	300802	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade	PACATUBA	C.E.P	61801250	Comp.	SALA 02			Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICÍPIO DE PACUJÁ			E-mail			
Endereço	Rua 22 de setembro, 325 Centro 62.180-000 PACUJÁ-CE						
CPF/CNPJ	07.734.148/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(88)9928-37653

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE.
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/300424.04/SEINFRA
CONTRATO Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO: 07/08/24 à 18/09/24
VALOR TOTAL: R$ 104.061,64
BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 8172-8 / CONTA CORRENTE: 62629-5
LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA / CNPJ Nº 39.965.225/0001-18

Luis Eduardo dos Santos Braga
LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 347111
CPF: 068.252.443-37

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 431340000 - Obras de terraplenagem

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20241499719

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	104.061,64	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	104.061,64
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	104.061,64
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**7jbzxemk2rwlsv3fgt6u4iocyqh**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	104.061,64	https://pacatuba.ce.gov.br/servicos/	(=) Valor do ISS	2.081,23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 23/09/24 13:20

Hora da emissão: 13:20:22

CONV: 90/2024
ORGÃO: SCP
BANCO: CEF
ORDEM BANCARIA

ATESTO
O recebimento dos Materiais/Serviços
Constantes do presente documentos
Nos termos da Lei nº 4.320/64

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO Nº:	1
PERÍODO:	07/08/2024 Á 18/09/2024
MEDIÇÃO EFETUADA:	18/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

VALOR CONTRATO	R$	2.014.646,75
VALOR MEDIÇÃO	R$	104.061,64
VALOR ACUMULADO	R$	104.061,64
SALDO	R$	1.910.585,12

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R$ 127,98	R$ 156,14	R$ 1.561,40		-	10,00	100%	R$ -	R$ -	1.561,40
1.2	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	40.000,00	R$ 0,35	R$ 0,43	R$ 17.200,00		-	40.000,00	100%	R$ -	R$ -	17.200,00
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	7,79	R$ 399,49	R$ 487,38	R$ 3.796,69		-	7,79	100%	R$ -	R$ -	3.796,69
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.880,00	R$ 4,23	R$ 5,16	R$ 14.860,80		-	2.880,00	100%	R$ -	R$ -	14.860,80
2.0		TERRAPLANAGEM												
2.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	45.854,60	R$ 1,07	R$ 1,31	R$ 60.069,53	2.455,80	2.455,80	43.398,80	95%	R$ 3.217,10	R$ 3.217,10	56.852,43
2.2	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	6.000,00	R$ 3,05	R$ 3,72	R$ 22.320,00		-	6.000,00	100%	R$ -	R$ -	22.320,00
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	88.332,00	R$ 2,46	R$ 3,00	R$ 264.996,00		-	88.332,00	100%	R$ -	R$ -	264.996,00
2.4	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	45.854,60	R$ 20,22	R$ 24,67	R$ 1.131.232,98	2.455,80	2.455,80	43.398,80	95%	R$ 60.584,59	R$ 60.584,59	1.070.648,40
2.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	45.854,60	R$ 4,14	R$ 5,05	R$ 231.565,73	1.282,00	1.282,00	44.572,60	97%	R$ 6.474,10	R$ 6.474,10	225.091,63
3.0		DRENAGEM												
3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	20,00	R$ 1.335,20	R$ 1.628,94	R$ 32.578,80	8,00	8,00	12,00	60%	R$ 13.031,52	R$ 13.031,52	19.547,28
3.2	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	R$ 2.204,12	R$ 2.689,03	R$ 26.890,30		-	10,00	100%	R$ -	R$ -	26.890,30
3.3	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	4,00	R$ 3.775,21	R$ 4.605,76	R$ 18.423,04		-	4,00	100%	R$ -	R$ -	18.423,04
3.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	80,00	R$ 434,01	R$ 529,49	R$ 42.359,20	32,00	32,00	48,00	60%	R$ 16.943,68	R$ 16.943,68	25.415,52
3.5	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	40,00	R$ 820,94	R$ 1.001,55	R$ 40.062,00		-	40,00	100%	R$ -	R$ -	40.062,00
3.6	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	16,00	R$ 1.539,82	R$ 1.878,58	R$ 30.057,28		-	16,00	100%	R$ -	R$ -	30.057,28
4.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
4.1	C1915	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 628,47	R$ 766,73	R$ 76.673,00	4,97	4,97	95,03	95%	R$ 3.810,65	R$ 3.810,65	72.862,35
					TOTAL GERAL C/BDI		R$ 2.014.646,75			VALOR DA MEDIÇÃO		R$ 104.061,64		
										VALOR ACUMULADA		R$ 104.061,64		
										SALDO		R$ 1.910.585,12		

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO Nº:	1
PERÍODO:	07/08/2024 Á 18/09/2024
MEDIÇÃO EFETUADA:	18/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

2.0		**TERRAPLANAGEM**						
2.1	**C2840**	**INDENIZAÇÃO DE JAZIDA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIRO 14 - TRECHO 5				596,00	596,00	M3
		BUEIRO 15 - TRECHO 5				577,80	577,80	M3
		BUEIRO 16 - TRECHO 5				611,60	611,60	M3
		BUEIRO 17 - TRECHO 5				670,40	670,40	M3
						Total	**2455,80**	**M3**
2.4	**C3179**	**ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIRO 14 - TRECHO 5				596,00	596,00	M3
		BUEIRO 15 - TRECHO 5				577,80	577,80	M3
		BUEIRO 16 - TRECHO 5				611,60	611,60	M3
		BUEIRO 17 - TRECHO 5				670,40	670,40	M3
						Total	**2455,80**	**M3**
2.5	**C3146**	**COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIRO 16 - TRECHO 5				611,60	611,60	M3
		BUEIRO 17 - TRECHO 5				670,40	670,40	M3
						Total	**1282,00**	**M3**
3.0		**DRENAGEM**						
3.1	**C0424**	**BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Lados**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BOCAS DE BUEIROS 14, 15, 16 E 17 DO TRECHO 5			2,00	4,00	8,00	UND
						Total	**8,00**	**UND**
3.4	**C0919**	**CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		CORPOS DE BUEIROS 14, 15, 16 E 17 DO TRECHO 5	8,00			4,00	32,00	M
						Total	**32,00**	**M**
4.0		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						
4.1	**C1915**	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4,97	4,97	%
						Total	**4,97**	**%**

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE


CONTRATO: 05-08/2024

EMPRESA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 39.965.225/0001-18

MEDIÇÃO Nº: 1º

PERÍODO: (07/08/2024 Á 18/09/2024)

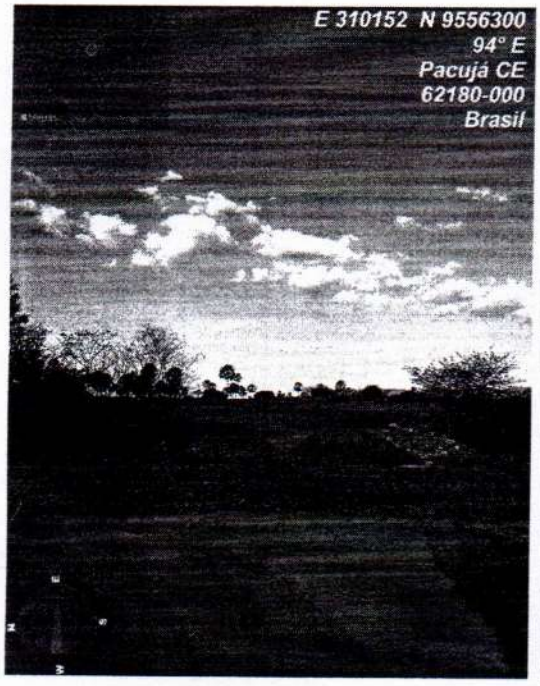

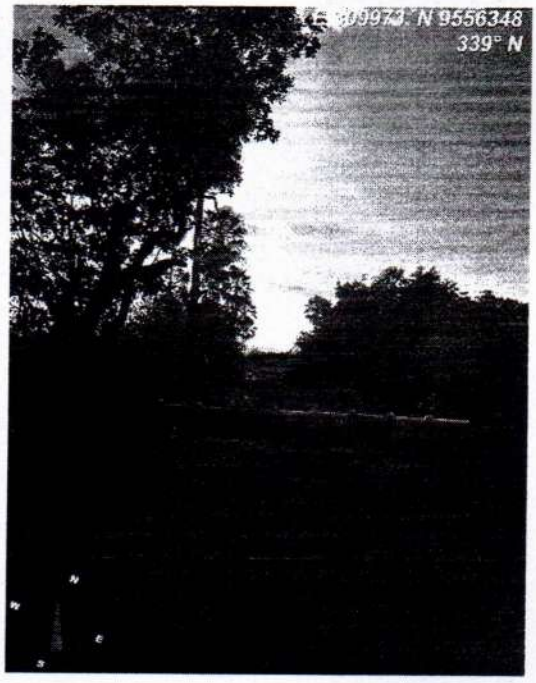



Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347111


PREFEITURA MUNICIPAL DE


PACUJÁ

O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

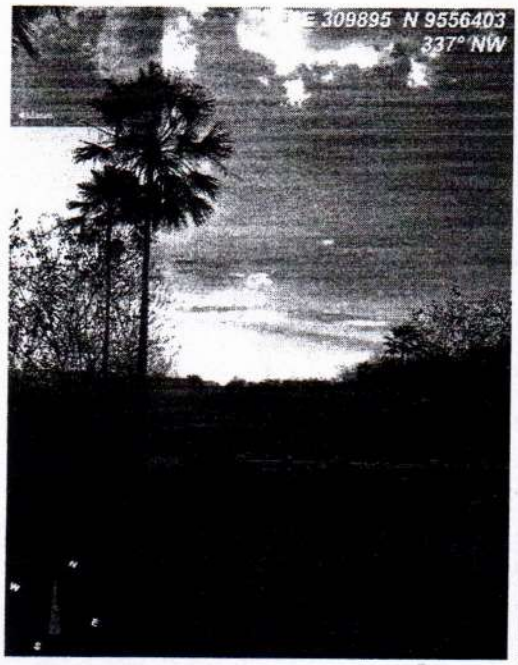

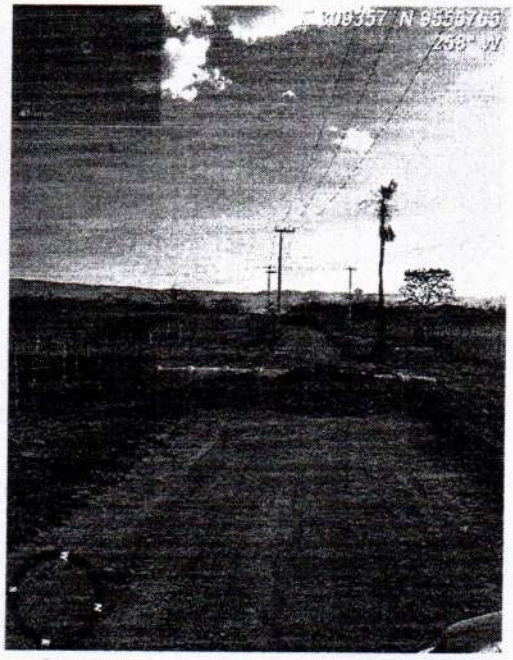

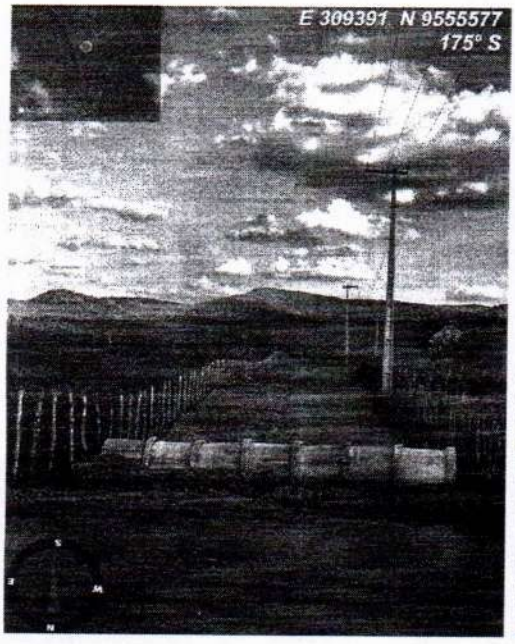

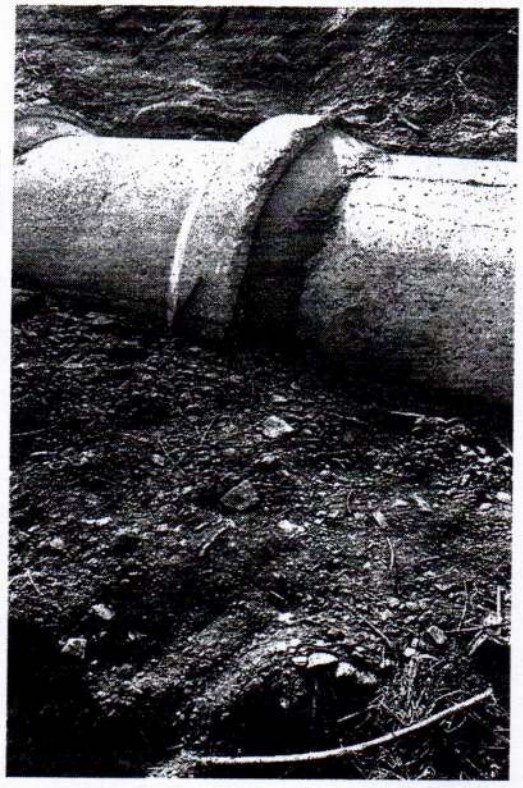


Luis Eduardo dos Santos Braga

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PACUJÁ

O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

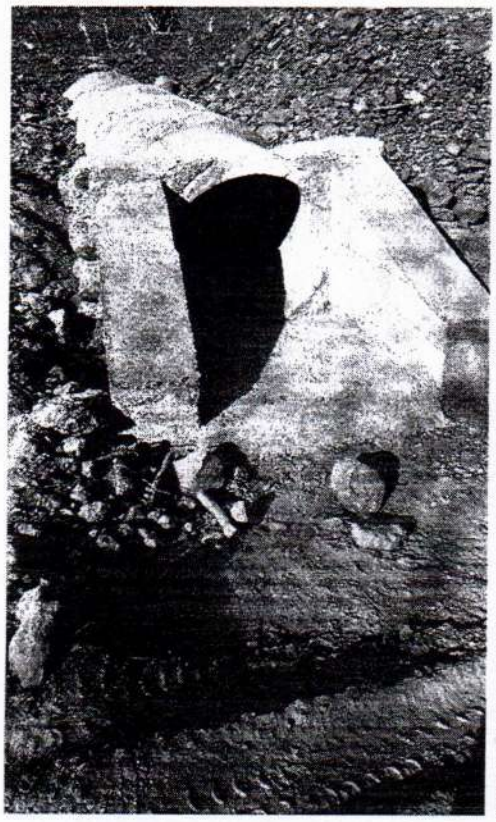







Luis Eduardo dos Santos Braga

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PACUJÁ

O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO





Luis Eduardo dos Santos Braga

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 34717-1

Prefeitura Municipal de Pacujá/CE

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SERVIÇO:	Recuperação de Estradas Vicinais na estrada Bom Gosto - Olho D'água - Santa Luzia - Vaquejador - Carro Quebrado no município de Pacujá/CE
CONTRATADA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
EDITAL:	CE/300424.04/SEINFRA
MEDIÇÃO:	01ª Medição Parcial
PERÍODO:	07/08/2024 a 18/09/2024

DIÁRIO DE OBRAS

agosto/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 001

DATA (dd/mm/aa): 07/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº

05.08 / 2024

CONSTRUTORA

LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X					

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SERVIÇOS PRELIMINARES**

- CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00m);

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 002

DATA (dd/mm/aa): 08/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇAO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇAO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00m);

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 003

DATA (dd/mm/aa): 09/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº

05.08 / 2024

CONSTRUTORA

LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00m);

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 004

DATA (dd/mm/aa): 10/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SEM ATIVIDADES**

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 005

DATA (dd/mm/aa): 11/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)**

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 006

DATA (dd/mm/aa): 12/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00m);

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 007

DATA (dd/mm/aa): 13/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 008

DATA (dd/mm/aa): 14/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)

» **DRENAGEM**
» - EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 009

DATA (dd/mm/aa): 15/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº

05.08 / 2024

CONSTRUTORA

LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)

» **DRENAGEM**
» - EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 010

DATA (dd/mm/aa): 16/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	**S**	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 011

DATA (dd/mm/aa): 17/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SEM ATIVIDADES**

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 012

DATA (dd/mm/aa): 18/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)**

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 013

DATA (dd/mm/aa): 19/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 014

DATA (dd/mm/aa): 20/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 015

DATA (dd/mm/aa): 21/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇAO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 016

DATA (dd/mm/aa): 22/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 017

DATA (dd/mm/aa): 23/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº

05.08 / 2024

CONSTRUTORA

LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 018

DATA (dd/mm/aa): 24/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 019

DATA (dd/mm/aa): 25/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 020

DATA (dd/mm/aa): 26/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 021

DATA (dd/mm/aa): 27/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 022

DATA (dd/mm/aa): 28/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 023

DATA (dd/mm/aa): 29/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 024

DATA (dd/mm/aa): 30/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	**S**	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CAT (4001 a 5000m)
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 025

DATA (dd/mm/aa): 31/08/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SEM ATIVIDADES**

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 026

DATA (dd/mm/aa): 01/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇAO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇAO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 027

DATA (dd/mm/aa): 02/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 028

DATA (dd/mm/aa): 03/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 029

DATA (dd/mm/aa): 04/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 030

DATA (dd/mm/aa): 05/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 031

DATA (dd/mm/aa): 06/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	**S**	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇAO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇAO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 032

DATA (dd/mm/aa): 07/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (FERIADO NACIONAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 033

DATA (dd/mm/aa): 08/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 034

DATA (dd/mm/aa): 09/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 035

DATA (dd/mm/aa): 10/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 036

DATA (dd/mm/aa): 11/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 037

DATA (dd/mm/aa): 12/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 038

DATA (dd/mm/aa): 13/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 039

DATA (dd/mm/aa): 14/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SEM ATIVIDADES**

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 040

DATA (dd/mm/aa): 15/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)**

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 041

DATA (dd/mm/aa): 16/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**

- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 042

DATA (dd/mm/aa): 17/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**

- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 043

DATA (dd/mm/aa): 18/09/24

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**

- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241500481

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0619137410**
Registro: **347111CE**

Empresa contratada: **PROJECON PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**
Registro : **0000458139-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA**
CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**
RUA 22 DE SETEMBRO
Nº: **325**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PACUJÁ**
UF: **CE**
CEP: **62180000**

Contrato: **05-08/2024**
Celebrado em:
Valor: **R$ 1,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Vinte e Dois de Setembro
Nº: **325**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Pacujá**
UF: **CE**
CEP: **62180000**
Data de Início: **07/08/2024**
Previsão de término: **31/12/2025**
Coordenadas Geográficas: **-3.979639, -40.69656**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **62180-000**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA**
CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM	12,99	km
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	136,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE. TOTAL EXTENSÃO: 12,99KM

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
Dados: 2024.09.23 21:11:26 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA - CPF: 068.252.443-37

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - CNPJ: 07.734.148/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **23/09/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8217348154**
