ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº 0000000073

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/03/2025	Competência	MAR/2025	Nº da NFS-e Substituída	72
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PACUJÁ-CE	Optante do Simples	**SIM**

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA							
Nome Fantasia	LOCMAQ SERVICOS							
Endereço	RUA CORONEL JOSÉ LIBÂNIO, 431 - CENTRO							
CPF/CNPJ	39.965.225/0001-18	Insc.Municipal	300802	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	PACATUBA	C.E.P	61801250	Comp.	SALA 02	Telefone	8582018987	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICÍPIO DE PACUJÁ			E-mail	
Endereço	Rua 22 de setembro, 325 Centro 62.180-000 PACUJÁ-CE				
CPF/CNPJ	07.734.148/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone (88)9928-37653

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE.
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/300424.04/SEINFRA
CONTRATO Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO: 13/03/25 à 20/03/25
VALOR TOTAL: R$ 222.948,99
BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 8172-8 / CONTA CORRENTE: 62629-5
LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA / CNPJ Nº 39.965.225/0001-18

Luis Eduardo dos Santos Braga
LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 347111
CPF: 068.252.443-37

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 431340000 - Obras de terraplenagem

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20241499719

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	222.948,99	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	222.948,99
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	222.948,99
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**usz4yrnjiexqg9l573faw8mcdbo**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	222.948,99	https://pacatuba.ce.gov.br/servicos/	(=) Valor do ISS	4.458,98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000072

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 21/03/25 09:34 Hora da emissão: 09:33:59

LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RECIBO

A EMPRESA **LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO **CNPJ N° 39.965.225/0001-18**, SITUADA À RUA CORONEL JOSÉ LIBÂNIO Nº 431, SALA 02 – CENTRO – PACATUBA – CEARÁ, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. IURI DA SILVA DUARTE**,** PORTADOR DO CPF Nº 069.109.673-21, **DECLARA** QUE RECEBEU A IMPORTÂNCIA DE **R$ 222.948,99 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)** DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**, INSCRITA NO **CNPJ Nº 07.734.148/0001-07**, SEDIADA NA RUA 22 DE SETEMBRO Nº 325, CENTRO, PACUJÁ, CEARÁ, CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE. PERÍODO DE MEDIÇÃO 13/03/25 À 20/03/25. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 73.

FORTALEZA – CE, 21 DE MARÇO DE 2025.

IURI DA SILVA DUARTE:06910967321

Assinado de forma digital por IURI DA SILVA DUARTE:06910967321

IURI DA SILVA DUARTE
CPF Nº 069.109.673-21

LOCMAQ SERVIÇOS
CNPJ 39.965.225/0001-18
locmaqserv@hotmail.com
(85) 98201-8987

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO Nº:	1º REFERENTE AO ADITIVO
PERÍODO:	13/03/2025 Á 20/03/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	20/03/2025

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATO ADITIVO:	**R$ 487.141,58**
VALOR MEDIÇÃO ADITIVO:	**R$ 222.948,99**
VALOR ACUMULADO ADITIVO:	**R$ 222.948,99**
SALDO ADITIVO:	**R$ 264.192,57**

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	R$ 127,98	R$ 156,14	R$ -		-	-	#DIV/0!	R$ -	R$ -	-
1.2	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	10.107,09	R$ 0,35	R$ 0,43	R$ 4.346,05	**4.750,33**	4.750,33	5.356,76	53%	R$ 2.042,64	R$ 2.042,64	2.303,41
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,77	R$ 399,49	R$ 487,38	R$ 375,28	**2,46**	2,46	- 1,69	-219%	R$ 1.198,95	R$ 1.198,95	- 823,67
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R$ 4,23	R$ 5,16	R$ -		-	-	#DIV/0!	R$ -	R$ -	-
2.0		**TERRAPLANAGEM**												
2.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	11.137,52	R$ 1,07	R$ 1,31	R$ 14.590,15	**5.153,44**	5.153,44	5.984,08	54%	R$ 6.751,01	R$ 6.751,01	7.839,14
2.2	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	1.500,00	R$ 3,05	R$ 3,72	R$ 5.580,00	**712,55**	712,55	787,45	52%	R$ 2.650,69	R$ 2.650,69	2.929,31
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	8.690,40	R$ 2,46	R$ 3,00	R$ 26.071,20	**8.690,40**	8.690,40	-	0%	R$ 26.071,20	R$ 26.071,20	-
2.4	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	11.137,52	R$ 20,22	R$ 24,67	R$ 274.762,62	**5.153,44**	5.153,44	5.984,08	54%	R$ 127.135,36	R$ 127.135,36	147.627,25
2.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	11.137,52	R$ 4,14	R$ 5,05	R$ 56.244,48	**5.153,44**	5.153,44	5.984,08	54%	R$ 26.024,87	R$ 26.024,87	30.219,60
3.0		**DRENAGEM**												
3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	R$ 1.335,20	R$ 1.628,94	R$ 16.289,40		-	10,00	100%	R$ -	R$ -	16.289,40
3.2	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	R$ 2.204,12	R$ 2.689,03	R$ 10.756,12	**4,00**	4,00	-	0%	R$ 10.756,12	R$ 10.756,12	-
3.3	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	0,00	R$ 3.775,21	R$ 4.605,76	R$ -		-	-	#DIV/0!	R$ -	R$ -	-
3.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	38,00	R$ 434,01	R$ 529,49	R$ 20.120,62		-	38,00	100%	R$ -	R$ -	20.120,62
3.5	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	15,00	R$ 820,94	R$ 1.001,55	R$ 15.023,25	**15,00**	15,00	-	0%	R$ 15.023,25	R$ 15.023,25	-
3.6	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	0,00	R$ 1.539,82	R$ 1.878,58	R$ -		-	-	#DIV/0!	R$ -	R$ -	-
3.7	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	42,02	R$ 374,99	R$ 457,49	R$ 19.223,73	**5,10**	5,10	36,92	88%	R$ 2.333,20	R$ 2.333,20	16.890,53
3.8	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	110,84	R$ 60,15	R$ 73,38	R$ 8.133,44	**16,32**	16,32	94,52	85%	R$ 1.197,56	R$ 1.197,56	6.935,88
3.9	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	62,00	R$ 206,57	R$ 252,02	R$ 15.625,24	**7,00**	7,00	55,00	89%	R$ 1.764,14	R$ 1.764,14	13.861,10
4.0		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**												
4.1	C1915	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	0,00	R$ 628,47	R$ 766,73	R$ -		-	-	#DIV/0!	R$ -	R$ -	-
					TOTAL GERAL C/BDI		**R$ 487.141,58**			**VALOR DA MEDIÇÃO**		**R$ 222.948,99**		
										VALOR ACUMULADA		**R$ 222.948,99**		
										SALDO		**R$ 264.192,57**		

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

Prefeitura Municipal de Pacujá/CE

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

SERVIÇO:	Recuperação de Estradas Vicinais na estrada Bom Gosto - Olho D'água - Santa Luzia - Vaquejador - Carro Quebrado no município de Pacujá/CE
CONTRATADA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
EDITAL:	CE/300424.04/SEINFRA
MEDIÇÃO:	01ª Medição Parcial (Referente ao Aditivo)
PERÍODO:	13/03/2025 a 20/03/2025

DIÁRIO DE OBRAS

março/2025

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 001

DATA (dd/mm/aa): 13/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X		X	X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- DESMATAMENTO DE JAZIDA
- LOCAÇÃO DA OBRA C/ AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- EXPURGO DE JAZIDA
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 002

DATA (dd/mm/aa): 14/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- DESMATAMENTO DE JAZIDA
- LOCAÇÃO DA OBRA C/ AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- EXPURGO DE JAZIDA
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 003

DATA (dd/mm/aa): 15/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 004

DATA (dd/mm/aa): 16/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 005

DATA (dd/mm/aa): 17/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO
- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 006

DATA (dd/mm/aa): 18/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO
- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 007

DATA (dd/mm/aa): 19/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 008

DATA (dd/mm/aa): 20/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	**Q**	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO
- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO Nº:	1º REFERENTE AO ADITIVO
PERÍODO:	13/03/2025 Á 20/03/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	20/03/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.2	**C3160**	**DESMATAMENTO DE JAZIDA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		DESMATAMENTO DE JAZIDA	23,75	200,00		1,00	4750,33	M2
						Total	**4750,33**	**M2**
1.3	**C2872**	**LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Coeficiente (M2 P/ HA)**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		SANTA LUZIA A ESTRADA VAQUEJADOR	3190,00	6,00	10000,00	1,00	1,91	HA
		VAQUEJADOR TRECHO 2	906,00	6,00	10000,00	1,00	0,54	HA
						Total	**2,46**	**HA**
2.0		**TERRAPLANAGEM**						
2.1	**C2840**	**INDENIZAÇÃO DE JAZIDA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		VAQUEJADOR TRECHO 1	372,00	6,40	0,40	1,00	952,32	M3
		VAQUEJADOR TRECHO 2	906,00	6,40	0,40	1,00	2319,36	M3
		BUEIROS				1881,76	1881,76	M3
						Total	**5153,44**	**M3**
2.2	**C3218**	**EXPURGO DE JAZIDA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		EXPURGO DE JAZIDA	23,75	200,00	0,15	1,00	712,55	M3
						Total	**712,55**	**M3**
2.3	**C3233**	**REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		VAQUEJADOR TRECHO 1	372,00	6,80		1,00	2529,60	M2
		VAQUEJADOR TRECHO 2	906,00	6,80		1,00	6160,80	M2
						Total	**8690,40**	**M2**

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO Nº:	1º REFERENTE AO ADITIVO
PERÍODO:	13/03/2025 Á 20/03/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	20/03/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

2.4	**C3179**	**ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		VAQUEJADOR TRECHO 1	372,00	6,40	0,40	1,00	952,32	M3
		VAQUEJADOR TRECHO 2	906,00	6,40	0,40	1,00	2319,36	M3
		BUEIROS				1881,76	1881,76	M3
						Total	**5153,44**	**M3**
2.5	**C3146**	**COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		VOLUME DO ITEM 2.4				5153,44	5153,44	M3
						Total	**5153,44**	**M3**
3.0		**DRENAGEM**						
3.2	**C0406**	**BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Lados**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 cm			2,00	2,00	4,00	UND
						Total	**4,00**	**UND**
3.5	**C0886**	**CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 cm	8,00			1,00	8,00	M
		CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 cm	7,00			1,00	7,00	M
						Total	**15,00**	**M**
3.7	**C0057**	**ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)**						
		Descrição	**Comprimento**	**Lados**	**Quantidade de Bueiro**	**Quantidade por Volume**	**Total**	**UND**
		CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60CM	7,00		1,00	0,2020	1,41	M3
		Descrição	**Comprimento**	**Lados**	**Quantidade de Bueiro**	**Quantidade por Volume**	**Total**	**UND**
		BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60CM		2,00	1,00	1,8430	3,69	M3
						Total	**5,10**	**M3**

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO Nº:	1º REFERENTE AO ADITIVO
PERÍODO:	13/03/2025 Á 20/03/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	20/03/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

3.8	**C1402**	**FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS**						
		Descrição	**Comprimento**	**Lados**	**Quantidade de Bueiro**	**Quantidade por Metro Quadrado**	**Total**	**UND**
		CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60CM	7,00		1,00	0,6800	4,76	M3
		Descrição	**Comprimento**	**Lados**	**Quantidade de Bueiro**	**Quantidade por Metro Quadrado**	**Total**	**UND**
		BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60CM		2,00	1,00	5,7800	11,56	M3
						Total	**16,32**	**M3**
3.9	**C0105**	**AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60CM	7,00			1,00	7,00	M
						Total	**7,00**	**M**

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE.

CONTRATO: 05-08/2024

EMPRESA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 39.965.225/0001-18


MEDIÇÃO Nº: 1º (REFERENTE AO ADITIVO)

PERÍODO: (13/03/2025 Á 20/03/2025)

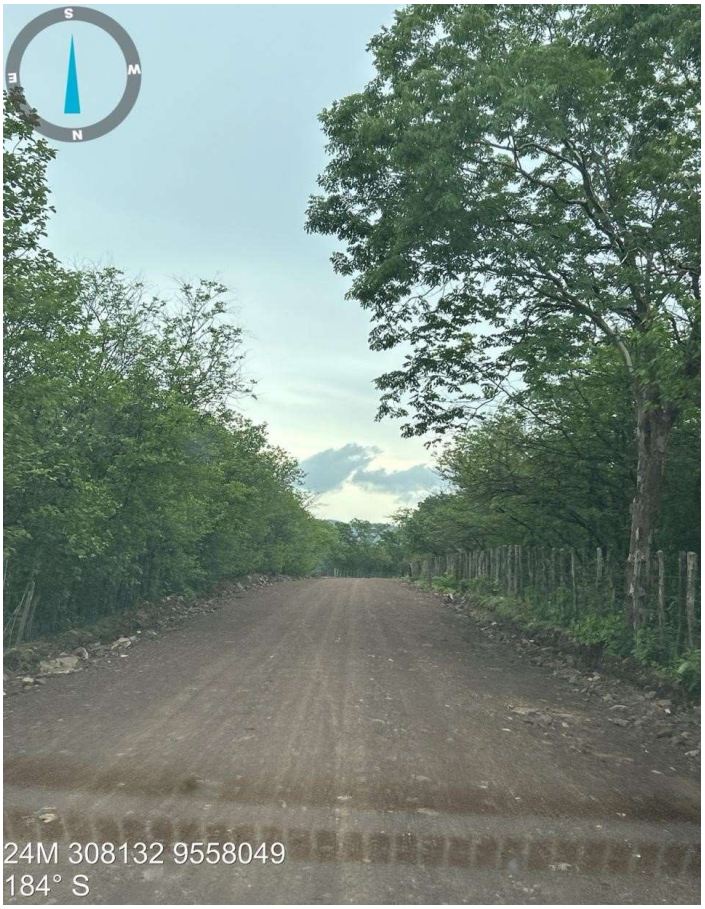

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111


FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

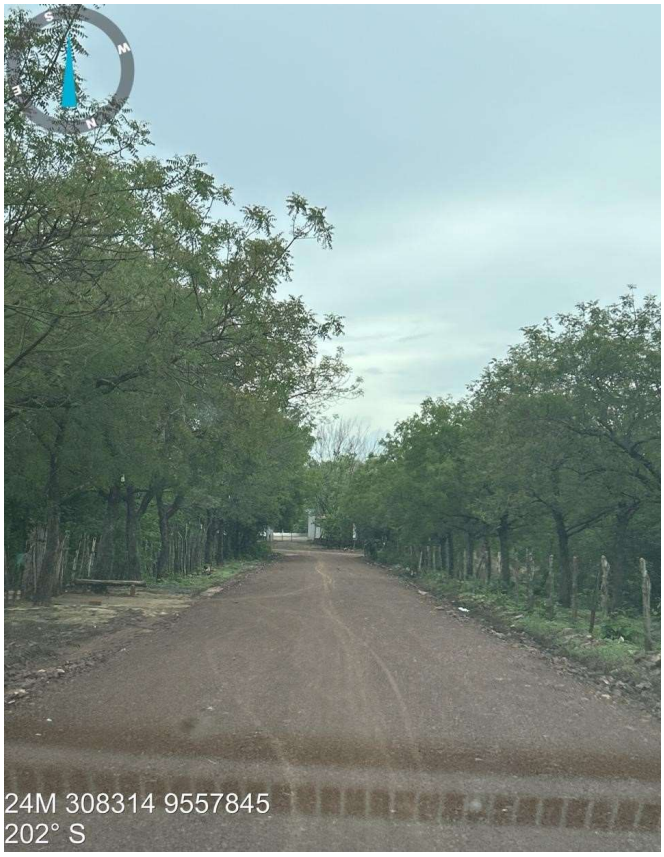



FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA


Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

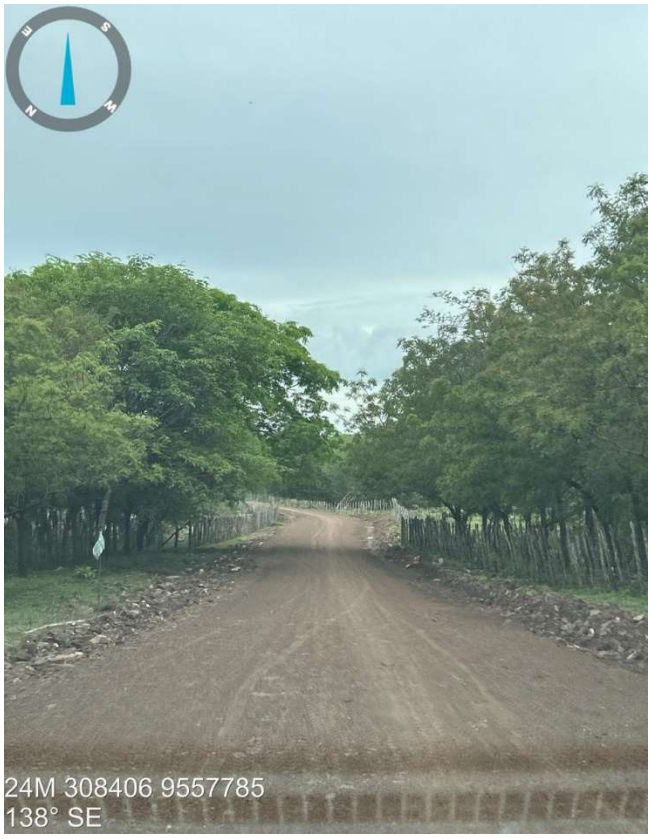



FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

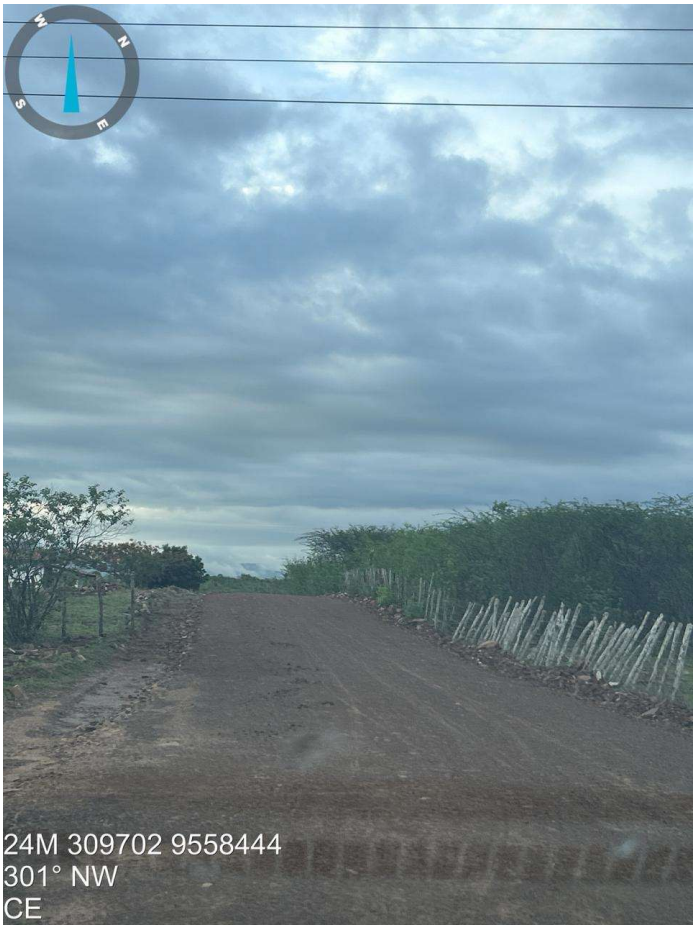



FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171





FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171





FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

Prefeitura Municipal de Pacujá/CE

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

SERVIÇO:	Recuperação de Estradas Vicinais na estrada Bom Gosto - Olho D'água - Santa Luzia - Vaquejador - Carro Quebrado no município de Pacujá/CE
CONTRATADA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
EDITAL:	CE/300424.04/SEINFRA
MEDIÇÃO:	01ª Medição Parcial (Referente ao Aditivo)
PERÍODO:	13/03/2025 a 20/03/2025

DIÁRIO DE OBRAS

março/2025

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 001

DATA (dd/mm/aa): 13/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	**Q**	S	S
				X		

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X		X	X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- DESMATAMENTO DE JAZIDA
- LOCAÇÃO DA OBRA C/ AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- EXPURGO DE JAZIDA
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 002

DATA (dd/mm/aa): 14/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- DESMATAMENTO DE JAZIDA
- LOCAÇÃO DA OBRA C/ AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- EXPURGO DE JAZIDA
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 003

DATA (dd/mm/aa): 15/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

ENGº FISCAL DA PREFEITURA

LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
Engº Fiscal do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 004

DATA (dd/mm/aa): 16/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 005

DATA (dd/mm/aa): 17/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO
- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 006

DATA (dd/mm/aa): 18/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO
- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 007

DATA (dd/mm/aa): 19/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 008

DATA (dd/mm/aa): 20/03/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	**Q**	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- EXECUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO
- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 39.965.225/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:49 do dia 30/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2025.
Código de controle da certidão: **E8A6.7DEA.7B3E.E250**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202502239693

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061457485
CNPJ / CPF: 39965225000118
RAZÃO SOCIAL: LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/02/2025 ÀS 16:53:22
VÁLIDA ATÉ 18/04/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 2025000030

Razão Social

LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000300802	C.N.P.J.: 39965225000118	CENTRO	61801250

Localizado RUA CORONEL JOSÉ LIBÂNIO, 431 - SALA 02 - PACATUBA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

302737 - LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA

Endereço

RUA CORONEL JOSÉ LIBÂNIO - SALA 02, 431

CENTRO PACATUBA-CE CEP: 61801250

Documento

C.N.P.J.: 39.965.225/0001-18

No. Requerimento

2025000030/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

C E R T I D Ã O

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
SECRETARIA DE FINANÇAS se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: https://www.pacatuba.ce.gov.br/

PACATUBA-CE, 22 DE JANEIRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 21/04/2025

COD. VALIDAÇÃO:**0123E245A00000302737**

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025000030

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 39.965.225/0001-18

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/04/25

PACATUBA-CE, 22 DE JANEIRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 22/01/25 às 13:06:50

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.965.225/0001-18

Razão Social: J V F DUARTE SERVICOS

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE PESSOA 717 / LAGOA DO MATO / ITATIRA / CE / 62725-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031022475558390696

Informação obtida em 14/03/2025 08:50:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.965.225/0001-18
Certidão nº: 89494872/2024
Expedição: 30/12/2024, às 12:03:43
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.965.225/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.
