ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº 0000000094

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	28/04/2025	Competência	ABR/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PACUJÁ-CE	Optante do Simples	**SIM**

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA							
Nome Fantasia	LOCMAQ SERVICOS							
Endereço	R CORONEL JOSE LIBANIO, 431 - CENTRO							
CPF/CNPJ	39.965.225/0001-18	Insc.Municipal	300802	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade		C.E.P	61801250	Comp.	SALA 02	Telefone	85987608306	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICÍPIO DE PACUJÁ			E-mail	
Endereço	Rua 22 de setembro, 325 Centro 62.180-000 PACUJÁ-CE				
CPF/CNPJ	07.734.148/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone (88)9928-37653

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE.
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/300424.04/SEINFRA
CONTRATO Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO: 11/04/25 à 28/04/25
VALOR TOTAL: R$ 155.081,50
BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 8172-8 / CONTA CORRENTE: 62629-5
LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA / CNPJ Nº 39.965.225/0001-18

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 347111
CPF: 068.252.443-37

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 431340000 - Obras de terraplenagem

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20241499719

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	155.081,50	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	155.081,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	155.081,50
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**2ezj87mcky3qag9it5pw6dvnlrb**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	155.081,50	https://pacatuba.ce.gov.br/servicos/	(=) Valor do ISS	3.101,63

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 28/04/25 17:13 Hora da emissão: 17:12:15

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ
PREFEITURA

PARECER TÉCNICO

CONTRATO	Nº 05-08/2024	**Nº MEDIÇÃO**	**VALOR MEDIÇÃO**
OBJETO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE	6	155.081,50
EMPRESA	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18	**PERÍODO**	
VALOR CONTRATO	R$ 2.014.646,75	11/04/2025	28/04/2025
ADITIVO	R$ 503.408,15	**ART FISCALIZAÇÃO**	**ART EXECUÇÃO**
VALOR CONTRATO + ADITIVO	R$ 2.518.054,90	CE20241500481	CE20241499719

ITEM	*DESCRIÇÃO*	*VALOR DO CONTRATO*	*MEDIÇÃO*	*ACUMULADO*	*SALDO*
1	TRECHO 1: BOM GOSTO A OLHO D'ÁGUA	2.518.054,90	155.081,50	984.283,88	1.533.771,02
2	TRECHO 2: SANTA LUZIA A ESTRADA VAQUEJADOR				
3	TRECHO 3: SANTA LUZIA A SANTA LUZIA 2				
4	TRECHO 4: VAQUEJADOR A CARRO QUEBRADO				
5	TRECHO 5: VAQUEJADOR A ESTRADA BOM GOSTO				
6	TRECHO 6: MILHÃS A OITIS				
7	TRECHO 7: PEDRA REDONDA A TAQUARI				
8	TRECHO 8: TAQUARI A ESTRADA P/ MILHÃ				
	TOTAL		**155.081,50**	984.283,88	1.533.771,02

Os serviços presente nos boletins de medição foram executados dentro das especificações técnicas exigidas por essa secretaria, e nas quantidades apontadas.

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE.
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO Nº:	6
PERÍODO:	11/04/2025 Á 28/04/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	28/04/2025

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATO:	**R$**	**2.014.646,75**
VALOR ADITIVO:	**R$**	**503.408,15**
VALOR CONTRATO + ADITIVO:	**R$**	**2.518.054,90**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$**	**155.081,50**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.094.709,11**
SALDO:	**R$**	**1.423.345,79**

								QUANTIDADE				**VALOR**		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R$ 127,98	R$ 156,14	R$ 1.561,40		10,00	-	0%	R$ -	R$ 1.561,40	-
1.2	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	50.000,00	R$ 0,35	R$ 0,43	R$ 21.500,00		20.501,39	29.498,61	59%	R$ -	R$ 8.815,60	12.684,40
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	7,79	R$ 399,49	R$ 487,38	R$ 3.796,69		4,10	3,69	47%	R$ -	R$ 1.998,26	1.798,43
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.880,00	R$ 4,23	R$ 5,16	R$ 14.860,80		1.440,00	1.440,00	50%	R$ -	R$ 7.430,40	7.430,40
2.0		**TERRAPLANAGEM**												
2.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	59.178,40	R$ 1,07	R$ 1,31	R$ 77.523,70	**5.878,80**	27.672,40	31.506,00	53%	R$ 7.701,23	R$ 36.250,84	41.272,86
2.2	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	7.500,00	R$ 3,05	R$ 3,72	R$ 27.900,00		3.075,21	4.424,79	59%	R$ -	R$ 11.439,78	16.460,22
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	114.160,00	R$ 2,46	R$ 3,00	R$ 342.480,00	**2.192,32**	48.636,32	65.523,68	57%	R$ 6.576,96	R$ 145.908,96	196.571,04
2.4	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	59.178,40	R$ 20,22	R$ 24,67	R$ 1.459.931,13	**3.574,80**	25.368,40	33.810,00	57%	R$ 88.190,32	R$ 625.838,43	834.092,70
2.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	59.178,40	R$ 4,14	R$ 5,05	R$ 298.850,92	**3.574,80**	25.368,40	33.810,00	57%	R$ 18.052,74	R$ 128.110,42	170.740,50
3.0		**DRENAGEM**												
3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	32,00	R$ 1.335,20	R$ 1.628,94	R$ 52.126,08	**8,00**	20,00	12,00	38%	R$ 13.031,52	R$ 32.578,80	19.547,28
3.2	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	R$ 2.204,12	R$ 2.689,03	R$ 26.890,30		2,00	8,00	80%	R$ -	R$ 5.378,06	21.512,24
3.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	132,00	R$ 434,01	R$ 529,49	R$ 69.892,68	**32,00**	80,00	52,00	39%	R$ 16.943,68	R$ 42.359,20	27.533,48
3.4	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	44,00	R$ 820,94	R$ 1.001,55	R$ 44.068,20		8,00	36,00	82%	R$ -	R$ 8.012,40	36.055,80
4.0		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**												
4.1	C1915	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 628,47	R$ 766,73	R$ 76.673,00	**5,98**	50,90	49,10	49%	R$ 4.585,05	R$ 39.026,56	37.646,44
					TOTAL GERAL C/BDI		**R$ 2.518.054,90**			**VALOR DA MEDIÇÃO**		**R$ 155.081,50**		
										VALOR ACUMULADA		**R$ 1.094.709,11**		
										SALDO		**R$ 1.423.345,79**		

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE.**
EMPRESA:	**LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18**
CONTRATO:	**Nº 05-08/2024**
MEDIÇÃO Nº:	**6**
PERÍODO:	**11/04/2025 Á 28/04/2025**
MEDIÇÃO EFETUADA:	**28/04/2025**

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

2.0		**TERRAPLANAGEM**						
2.1	**C2840**	**INDENIZAÇÃO DE JAZIDA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		TAQUARI A ESTRADA P/ MILHÃ	900,00	6,40	0,40	1,00	2304,00	M3
		BUEIRO 18 - TRECHO 6				898,00	898,00	M3
		BUEIRO 21 - TRECHO 7				956,20	956,20	M3
		BUEIRO 22 - TRECHO 7				902,40	902,40	M3
		BUEIRO 23 - TRECHO 7				818,20	818,20	M3
						Total	**5878,80**	**M3**
2.3	**C3233**	**REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		TAQUARI A ESTRADA P/ MILHÃ	322,40	6,80		1,00	2192,32	M2
						Total	**2192,32**	**M2**
2.4	**C3179**	**ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIRO 18 - TRECHO 6				898,00	898,00	M3
		BUEIRO 21 - TRECHO 7				956,20	956,20	M3
		BUEIRO 22 - TRECHO 7				902,40	902,40	M3
		BUEIRO 23 - TRECHO 7				818,20	818,20	M3
						Total	**3574,80**	**M3**
2.5	**C3146**	**COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIRO 18 - TRECHO 6				898,00	898,00	M3
		BUEIRO 21 - TRECHO 7				956,20	956,20	M3
		BUEIRO 22 - TRECHO 7				902,40	902,40	M3
		BUEIRO 23 - TRECHO 7				818,20	818,20	M3
						Total	**3574,80**	**M3**
3.0		**DRENAGEM**						
3.1	**C0424**	**BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Lados**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BOCAS DO BUEIRO 18 DO TRECHO 6 E BOCAS DOS BUEIROS 21, 22 E 23 DO TRECHO 7			2,00	4,00	8,00	UND
						Total	**8,00**	**UND**
3.3	**C0919**	**CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Lados**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		CORPO DO BUEIRO 18 DO TRECHO 6 E BOCA DOS BUEIROS 21, 22 E 23 DO TRECHO 7	8,00			4,00	32,00	M
						Total	**32,00**	**M**
4.0		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						
4.1	**C1915**	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				5,98	5,98	%
						Total	**5,98**	**%**

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE.

CONTRATO: 05-08/2024

EMPRESA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 39.965.225/0001-18

MEDIÇÃO Nº: 6º

PERÍODO: (11/04/2025 Á 28/04/2025)





Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA







Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ
PREFEITURA







Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA







Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA








Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ PREFEITURA



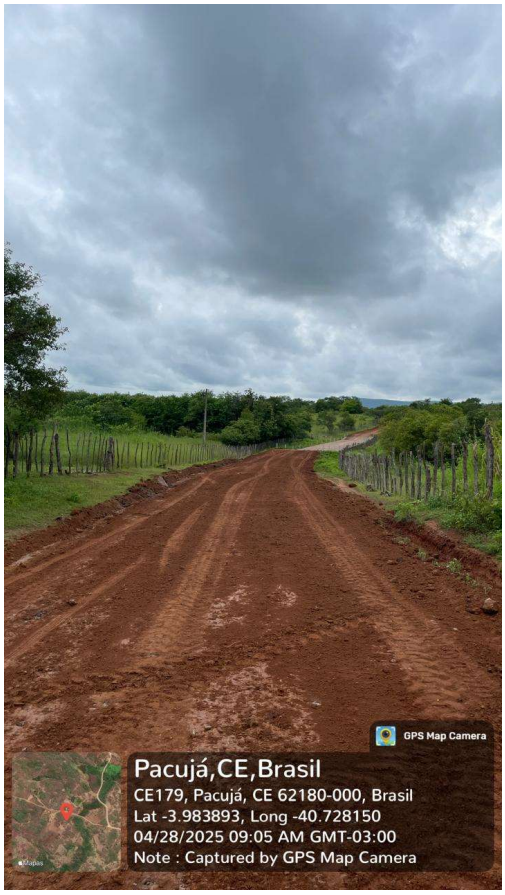



FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

Prefeitura Municipal de Pacujá/CE

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

SERVIÇO:	Recuperação de Estradas Vicinais na estrada Bom Gosto - Olho D'água - Santa Luzia - Vaquejador - Carro Quebrado no município de Pacujá/CE
CONTRATADA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
EDITAL:	CE/300424.04/SEINFRA
MEDIÇÃO:	06ª Medição Parcial
PERÍODO:	11/04/2025 a 28/04/2025

DIÁRIO DE OBRAS

abril/2025

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 248

DATA (dd/mm/aa): 11/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	**S**	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M

» **DRENAGEM**
- CORPO DE BUIERO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 249

DATA (dd/mm/aa): 12/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 250

DATA (dd/mm/aa): 13/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 251

DATA (dd/mm/aa): 14/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M

» **DRENAGEM**
- CORPO DE BUIERO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 252

DATA (dd/mm/aa): 15/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M

» **DRENAGEM**
- CORPO DE BUIERO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 253

DATA (dd/mm/aa): 16/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	**Q**	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M

» **DRENAGEM**
- CORPO DE BUIERO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 254

DATA (dd/mm/aa): 17/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	**Q**	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X			X	X	X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M

» **DRENAGEM**
- CORPO DE BUIERO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 255

DATA (dd/mm/aa): 18/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	**S**	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (FERIADO NACIONAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 256

DATA (dd/mm/aa): 19/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 257

DATA (dd/mm/aa): 20/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 258

DATA (dd/mm/aa): 21/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (FERIADO NACIONAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 259

DATA (dd/mm/aa): 22/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- BOCA DE BUIERO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 260

DATA (dd/mm/aa): 23/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- BOCA DE BUIERO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 261

DATA (dd/mm/aa): 24/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	**Q**	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- BOCA DE BUIERO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 262

DATA (dd/mm/aa): 25/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	**S**	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- BOCA DE BUIERO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 263

DATA (dd/mm/aa): 26/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 264

DATA (dd/mm/aa): 27/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PACUJÁ
PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 265

DATA (dd/mm/aa): 28/04/25

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

CONTRATO Nº: 05.08 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. PRELIMINARES DESMATAM. JAZIDA	SERV. PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA	TERRAPLENAGEM INDENIZ./EXP. JAZ.	TERRAPLENAGEM REGUL./ESCAV./COMP.	DRENAGEM
X				X	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **TERRAPLENAGEM**
- ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

» **DRENAGEM**
- BOCA DE BUIERO SIMPLES TUBULAR D=80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RECIBO

A EMPRESA **LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO **CNPJ N° 39.965.225/0001-18**, SITUADA À RUA CORONEL JOSÉ LIBÂNIO Nº 431, SALA 02 – CENTRO – PACATUBA – CEARÁ, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. IURI DA SILVA DUARTE**,** PORTADOR DO CPF Nº 069.109.673-21, **DECLARA** QUE RECEBEU A IMPORTÂNCIA DE **R$ 155.081,50 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)** DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**, INSCRITA NO **CNPJ Nº 07.734.148/0001-07**, SEDIADA NA RUA 22 DE SETEMBRO Nº 325, CENTRO, PACUJÁ, CEARÁ, CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE. PERÍODO DE MEDIÇÃO 11/04/25 à 28/04/25. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94.

FORTALEZA – CE, 28 DE ABRIL DE 2025.

IURI DA SILVA DUARTE:06910967321

Assinado de forma digital por IURI DA SILVA DUARTE:06910967321

IURI DA SILVA DUARTE
CPF Nº 069.109.673-21

LOCMAQ SERVIÇOS
CNPJ 39.965.225/0001-18
locmaqserv@hotmail.com
(85) 98201-8987

LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ Nº 39.965.225/0001-18

RUA CORONEL JOSÉ LIBANIO Nº 431, SALA 02 – CENTRO – PACATUBA - CE

locmaqserv@hotmail.com **(85) 9.8201-8987**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 39.965.225/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:49 do dia 30/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2025.
Código de controle da certidão: **E8A6.7DEA.7B3E.E250**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202505520580

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061457485
CNPJ / CPF: 39965225000118
RAZÃO SOCIAL: LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2025 ÀS 18:03:05
VÁLIDA ATÉ 27/06/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 2025000256

Razão Social

LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000300802	C.N.P.J.: 39965225000118	CENTRO	61801250

Localizado R CORONEL JOSE LIBANIO, 431 - SALA 02 - -CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

302737 - LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA

Endereço

R CORONEL JOSE LIBANIO, 431 SALA 02

CENTRO -CE CEP: 61801250

Documento

C.N.P.J.: 39.965.225/0001-18

No. Requerimento

2025000256/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

C E R T I D Ã O

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
SECRETARIA DE FINANÇAS se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: https://www.pacatuba.ce.gov.br/

PACATUBA-CE, 28 DE ABRIL DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 26/07/2025

COD. VALIDAÇÃO:**0012C450A00000302737**

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025000256

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 39.965.225/0001-18

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/07/25

PACATUBA-CE, 28 DE ABRIL DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/04/25 às 18:09:16

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.965.225/0001-18

Razão Social: J V F DUARTE SERVICOS

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE PESSOA 717 / LAGOA DO MATO / ITATIRA / CE / 62725-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041709485558390657

Informação obtida em 28/04/2025 18:05:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.965.225/0001-18
Certidão nº: 23489807/2025
Expedição: 28/04/2025, às 18:06:28
Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.965.225/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.
