



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Te atendendo com qualidade e excelência.

CNPJ: 27004063/0001-72



À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de PACUJÁ/CE

PACUJÁ-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0208.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARJETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0208/2021**, pelo preço global de **R\$ 407.109,85 (quatrocentos e sete mil cento e nove reais e oitenta e cinco centavos)**, conforme resumo abaixo, com prazo de execução de até 90 (NOVENTA) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Srº **EDSON RAMOS ROCHA**, portador do CPF nº: 033.182.373-02, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidades pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Edson Ramos Rocha
CPF: 033.182.373-02
Sócio – Proprietário

Jorge Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA: CE 40.509/D

ENOCH .F. Guimarães Jr
Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4
Consultor Técnico Ambiental
Registro IBAMA 331652

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

1962

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

1962

1962

1962

1962

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

1962




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAS DO MUNICÍPIO DE FACULDA	DATA:	15/03/2017
DESCRIÇÃO:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAS DO MUNICÍPIO DE FACULDA	SEI:	26.110
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO - FACULDA - CE	SEINFRA:	SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DIVERSOS							220.600,80
1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	525.240,00	0,33	0,09	0,42	220.600,80
VALOR BDI TOTAL:									47.271,60
VALOR ORÇAMENTO:									173.329,20
VALOR TOTAL:									220.600,80

Duzentos e Vinte Mil e Seiscentos reais e Oitenta centavos

ENOCH F. Guimarães Jr
 Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4
 Consultor Técnico Ambiental
 Registro IBAMA 331652

PLENE S/A C. FERNAMENTE DE LICITAÇÕES
 Fl. 1755
 Rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	RICO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PAZUVA	DATA:	19/09/2021	
	DESCRIÇÃO:	RICO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PAZUVA	POSTO:	VERSÃO:	
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PAZUVA - CE	SÉRIE:	001 - COM DESCRIÇÃO	HORA:
				COMPOSIÇÃO PROGRAMADA:	50% 50%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS DIVERSOS	220.600,80	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			55.150,20	55.150,20	55.150,20	55.150,20	220.600,80
		220.600,80	55.150,20	55.150,20	55.150,20	55.150,20	220.600,80
			55.150,20	110.300,40	165.450,60	220.600,80	


ENOCH .F. Guimarães Jr
 Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4
 Consultor Técnico Ambiental
 Registro IBAMA 331652

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Nº. 1.756
 Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJA	DATA:	16/06/2021	BDI - 26,17%
	DESCRIÇÃO:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJA	FONTE:	SEINFRA	SEINFRA
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PACUJA - CE.	SEINFRA:	287.1.000-2600000000	SEINFRA:
			COMPOSIÇÕES (SEINFRA):	0,00%	0,00%

1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UMID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9815 ENCARGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00100000	26,4700	0,0260
17889 MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00020000	26,5400	0,0053
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,0500	0,3010
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,3323
VALOR:					0,33

CIRCULAR DE LICITAÇÕES
 Nº. 1757
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FACULMÁ	DATA: 15/02/2021	BDI = 28,17%
DESCRIÇÃO:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FACULMÁ	FORTE:	VERSÃO:
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO - FACULMÁ - CE.	SEMPRA	021 1 001 (DESCRIÇÃO)
			02100003 (FICINAS)
			0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2,0% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

SOARES FERREIRA
 Fl. 1358
 Rubrica

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	ROCO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PAQUÁ	DATA:	13/05/2021	BDI: 28,17%	
	DESCRIÇÃO:	ROCO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PAQUÁ	FONTE:	URBANA	VERSÃO:	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PAQUÁ - CE.	ORÇAMA:	021 - COM DESPESAS	03/2021	03/2021
				CONTRIBUICAO PROPRIA	8,00% 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	18,80	18,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Encargos	0,07	0,07
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Costeio Alimentação	0,00	0,00
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Recorrência Sem Justa Causa	3,95	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

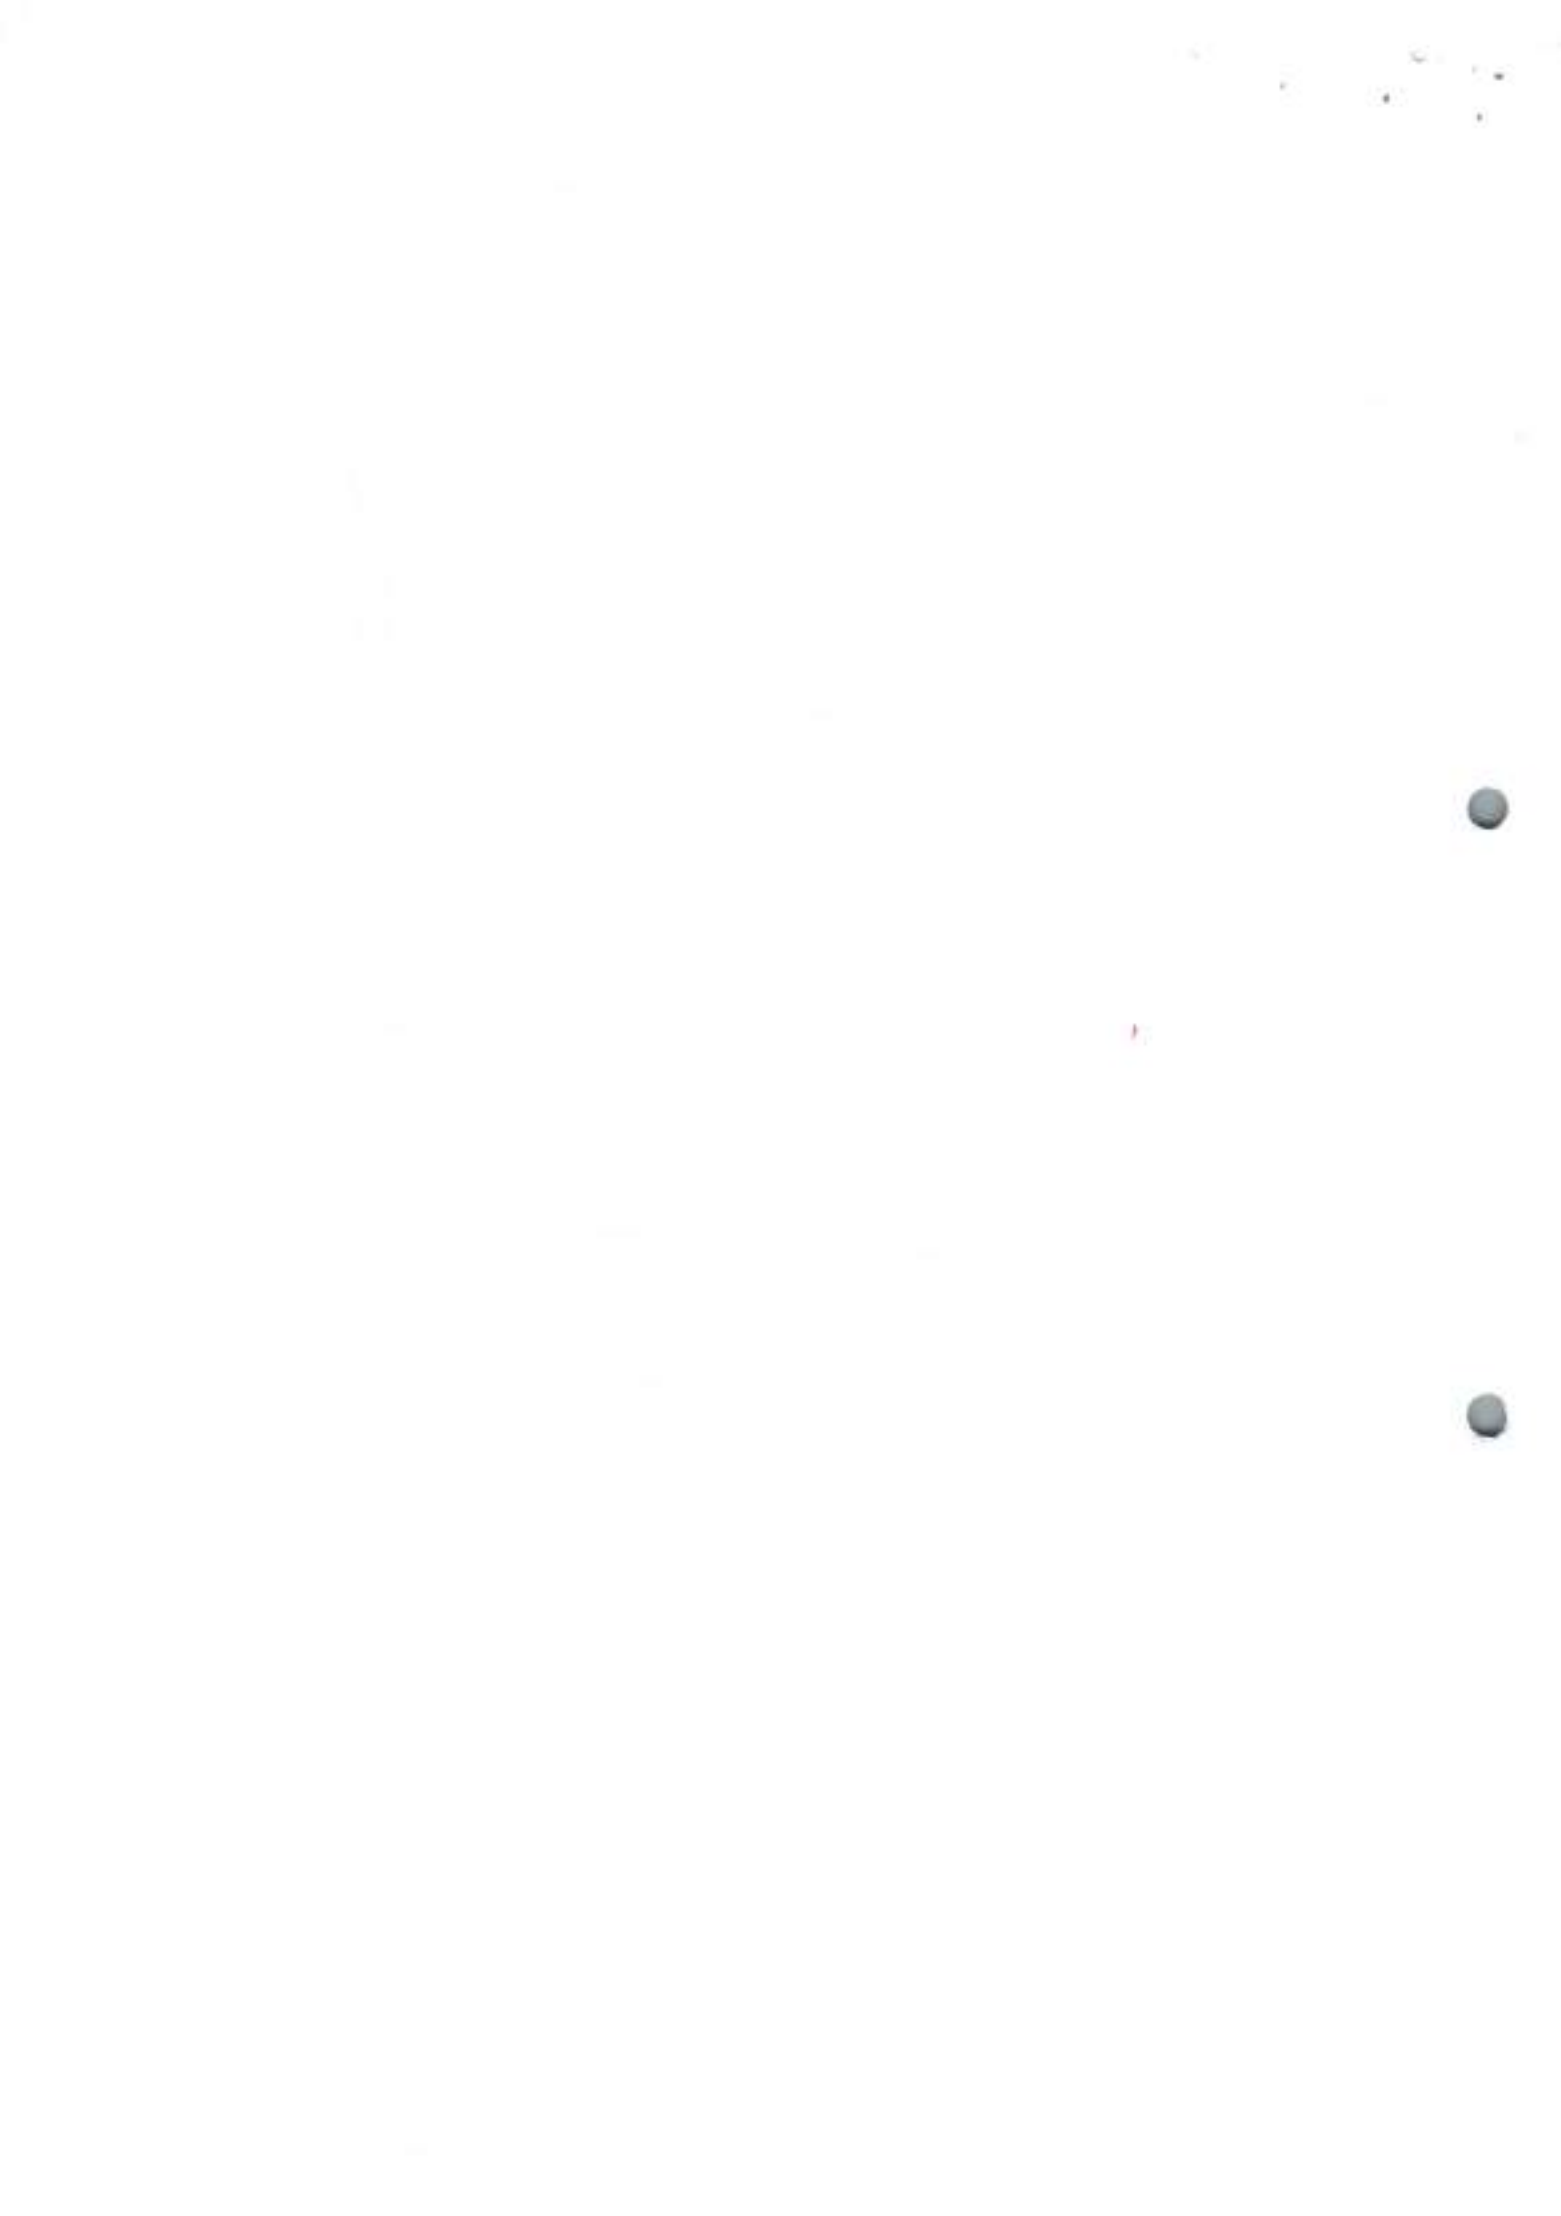


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Fl. 1.759

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENSOS BALDIOS	DATA:	10/08/2011 BDI: 28,17%
DESCRIÇÃO:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENSOS BALDIOS	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS - PARRAL - CE	VERBA:	SEM COM DESTINAÇÃO
		RECURSO:	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DIVERSOS						186.509,05
1.1	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	57.009,00	0,55	0,70	39.908,30
1.2	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	SEINFRA	M3	486,90	17,74	22,74	11.072,11
1.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	19.953,15	4,37	5,60	111.737,64
1.4	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	56.850,00	0,33	0,42	23.793,00
VALOR BDI TOTAL:								40.626,72
VALOR ORÇAMENTO:								145.882,33
VALOR TOTAL:								186.509,05

Cento e Oitenta e Seis Mil Quinhentos e Nove reais e Cinco centavos

[Handwritten Signature]
ENOCK F. Guimarães Jr
 Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4
 Consultor Técnico Ambiental
 Registro IBAMA 331652

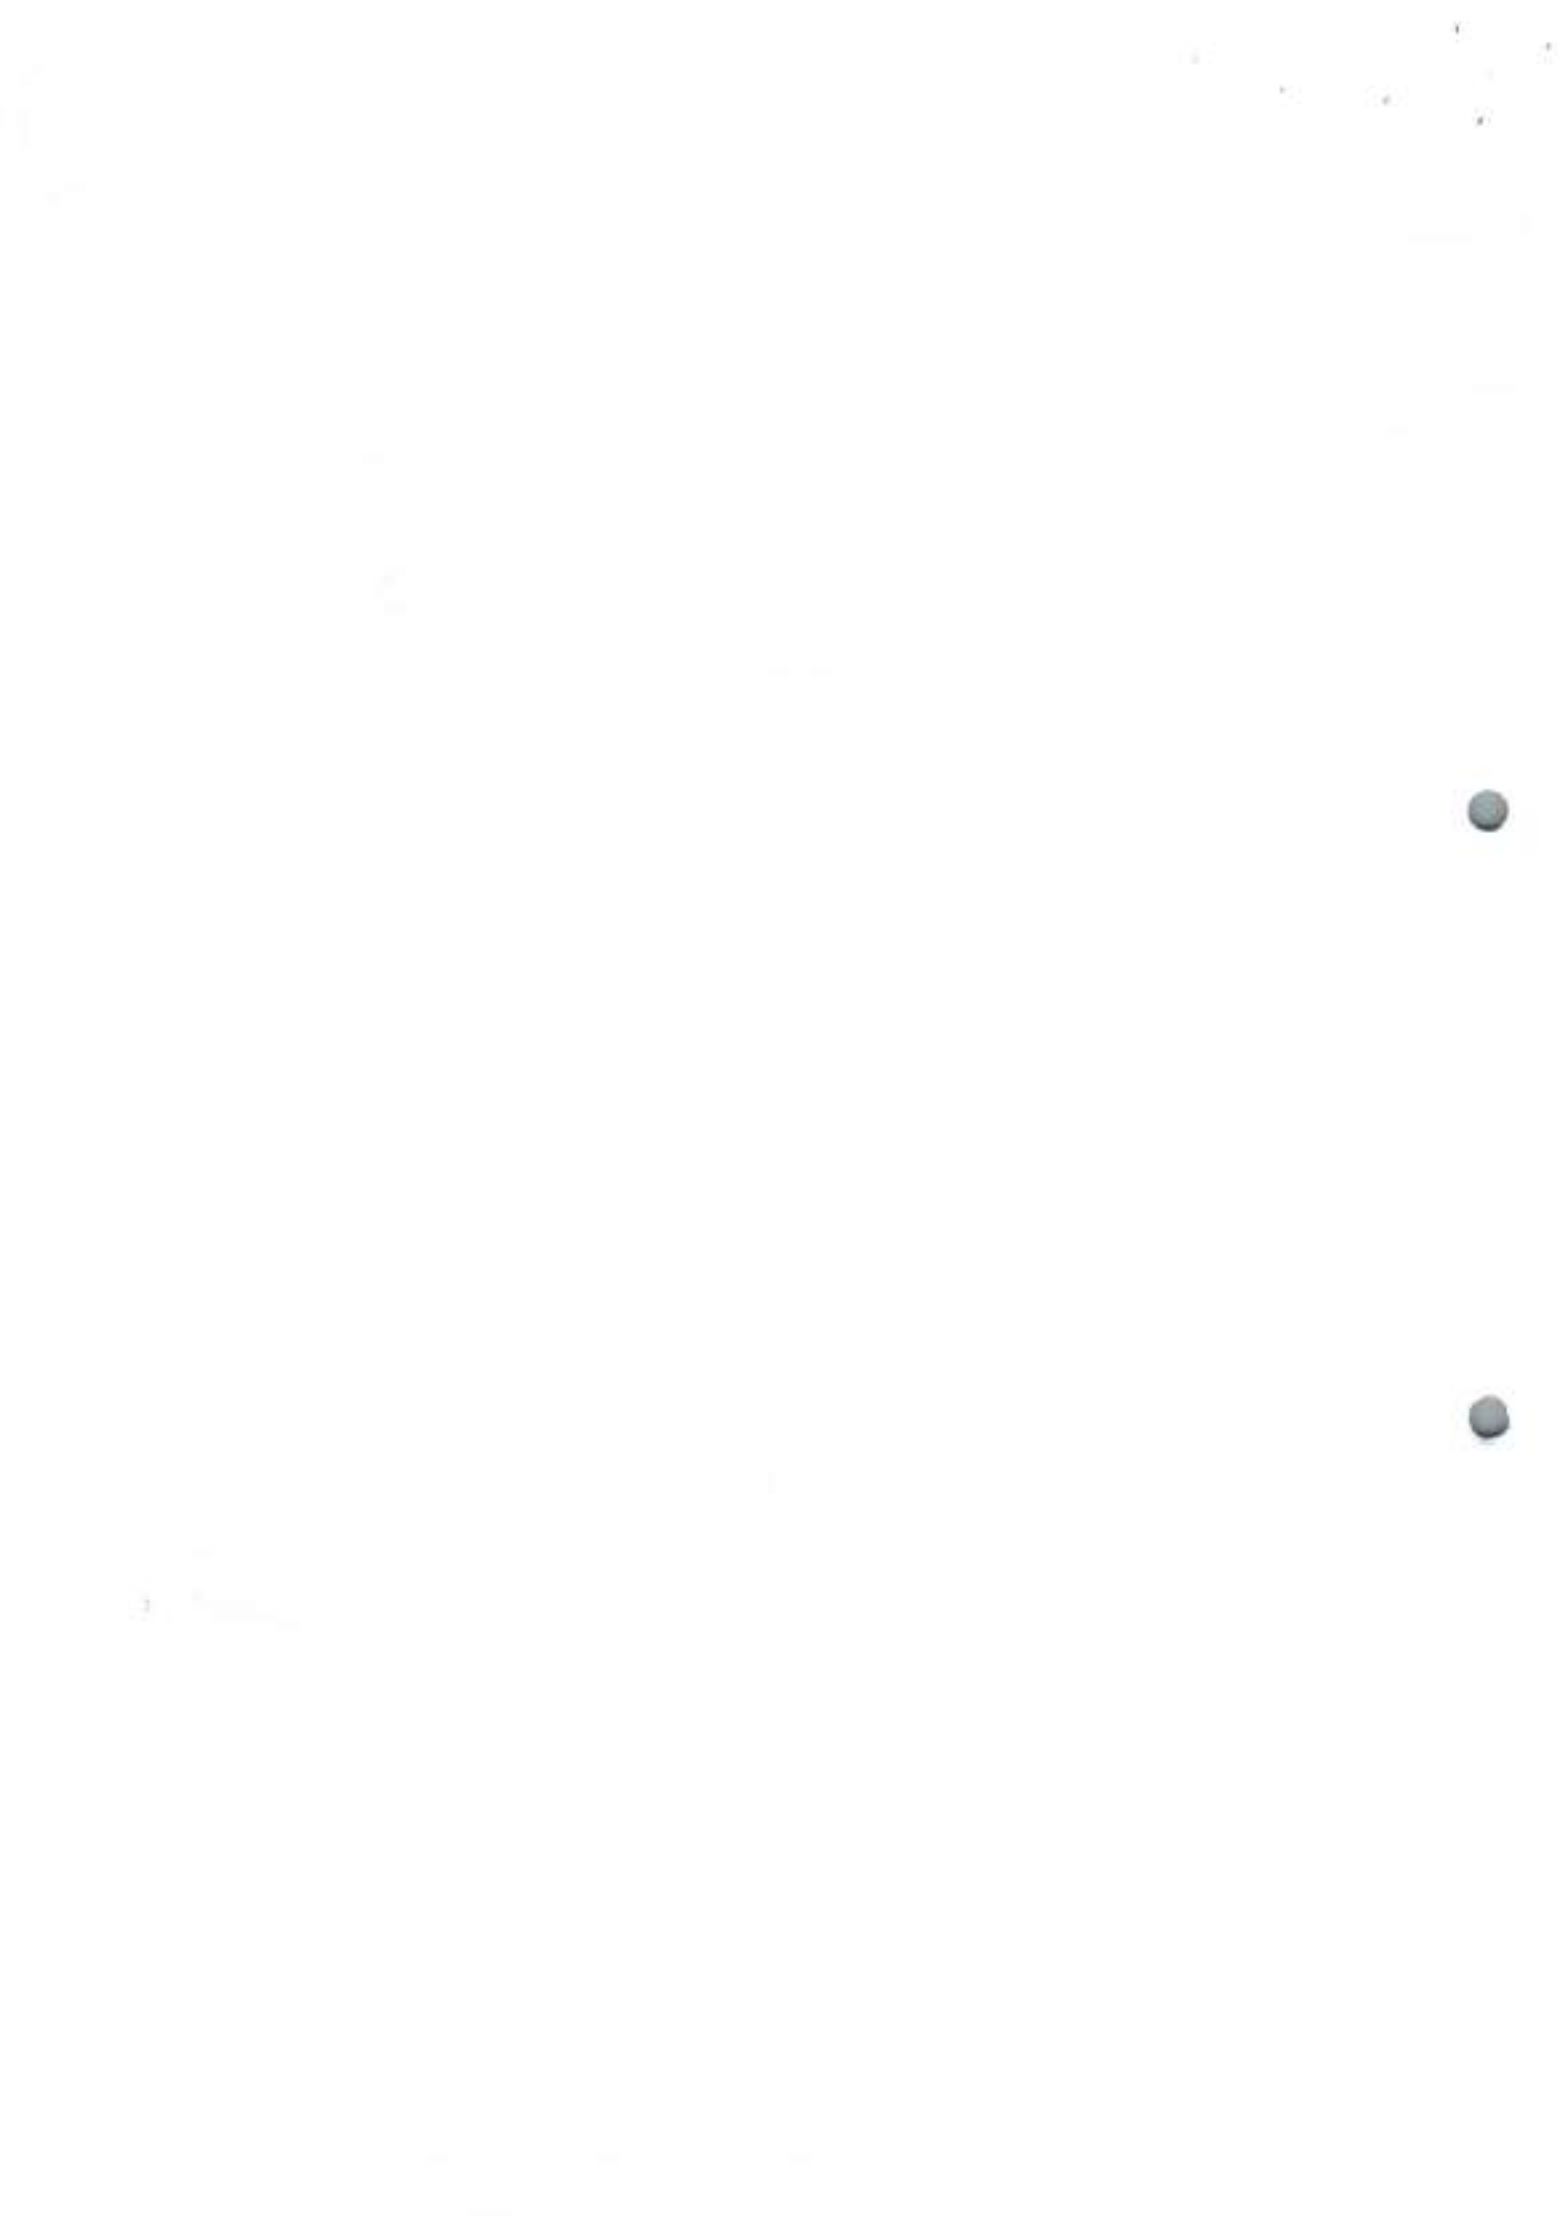

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Fl. 1760
 Rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA	BTI
OBRA:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENO BALDIOS	16/09/2021	25.17%
DESCRIÇÃO:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENO BALDIOS	FORTE	VERSAO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS - PRAÇA - CE	BRUNO	RES
		COMPLETAR PROPOSTA	5,00% 47,10% 50,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS DIVERSOS	186.509,05	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%'
			46.627,27	46.627,27	46.627,27	46.627,24	186.509,05
1.1	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	39.906,30	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%'
			9.976,58	9.976,58	9.976,58	9.976,58	39.906,30
1.2	LIMPEZA DE BUEIRO	11.072,11	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%'
			2.768,03	2.768,03	2.768,03	2.768,02	11.072,11
1.3	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	111.737,64	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%'
			27.934,41	27.934,41	27.934,41	27.934,41	111.737,64
1.4	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	23.793,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%'
			5.948,25	5.948,25	5.948,25	5.948,25	23.793,00
		186.509,05	46.627,27	46.627,27	46.627,27	46.627,24	186.509,05
			46.627,27	93.254,54	139.881,81	186.509,05	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO, CAPINA E ROÇO DE TERREMS BALDIOS		DATA: 19/08/2021	EM: 2021	PROJETO: 01/2021
DESCRIÇÃO:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO, CAPINA E ROÇO DE TERREMS BALDIOS		FONTE:	VERBA:	ORÇ:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS - PACUJÁ - CE.		SEINFRA	327 COM DESONERACAO	60,88%
				COMPOSICAO PROPRIA	0,00%
					39,12%

1.1. C3084 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00161957	27,3400	0,0442
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03233333	15,5500	0,5028
TOTAL MAO DE OBRA:						0,5470
VALOR:						6,88

1.2. C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,08700000	27,3400	2,3620
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97000000	15,5500	15,0835
TOTAL MAO DE OBRA:						17,7365
VALOR:						17,74

1.3. C3888 - CIMAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19400000	20,7700	4,0294
TOTAL MAO DE OBRA:						4,0294
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02485	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1200	0,3360
TOTAL MATERIAL:						0,3360
VALOR:						4,37

1.4. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00097000	27,3400	0,0265
07988	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019400	27,4200	0,0053
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01940000	15,5500	0,3017
TOTAL MAO DE OBRA:						0,3335
VALOR:						0,33



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Fl. 1.762
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENS BALDOS	DATA:	13/05/2021	BDI = 28,17%	
	DESCRIÇÃO:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENS BALDOS	FONTE:	VERBAS:	ICMS:	IRRF:
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS - PACUJÁ - CE.	DESCRIÇÃO:	COMPOSIÇÃO PROPRIAS:	5,00%	0,00%


COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2,0% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%
 $(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1+I) - 1$

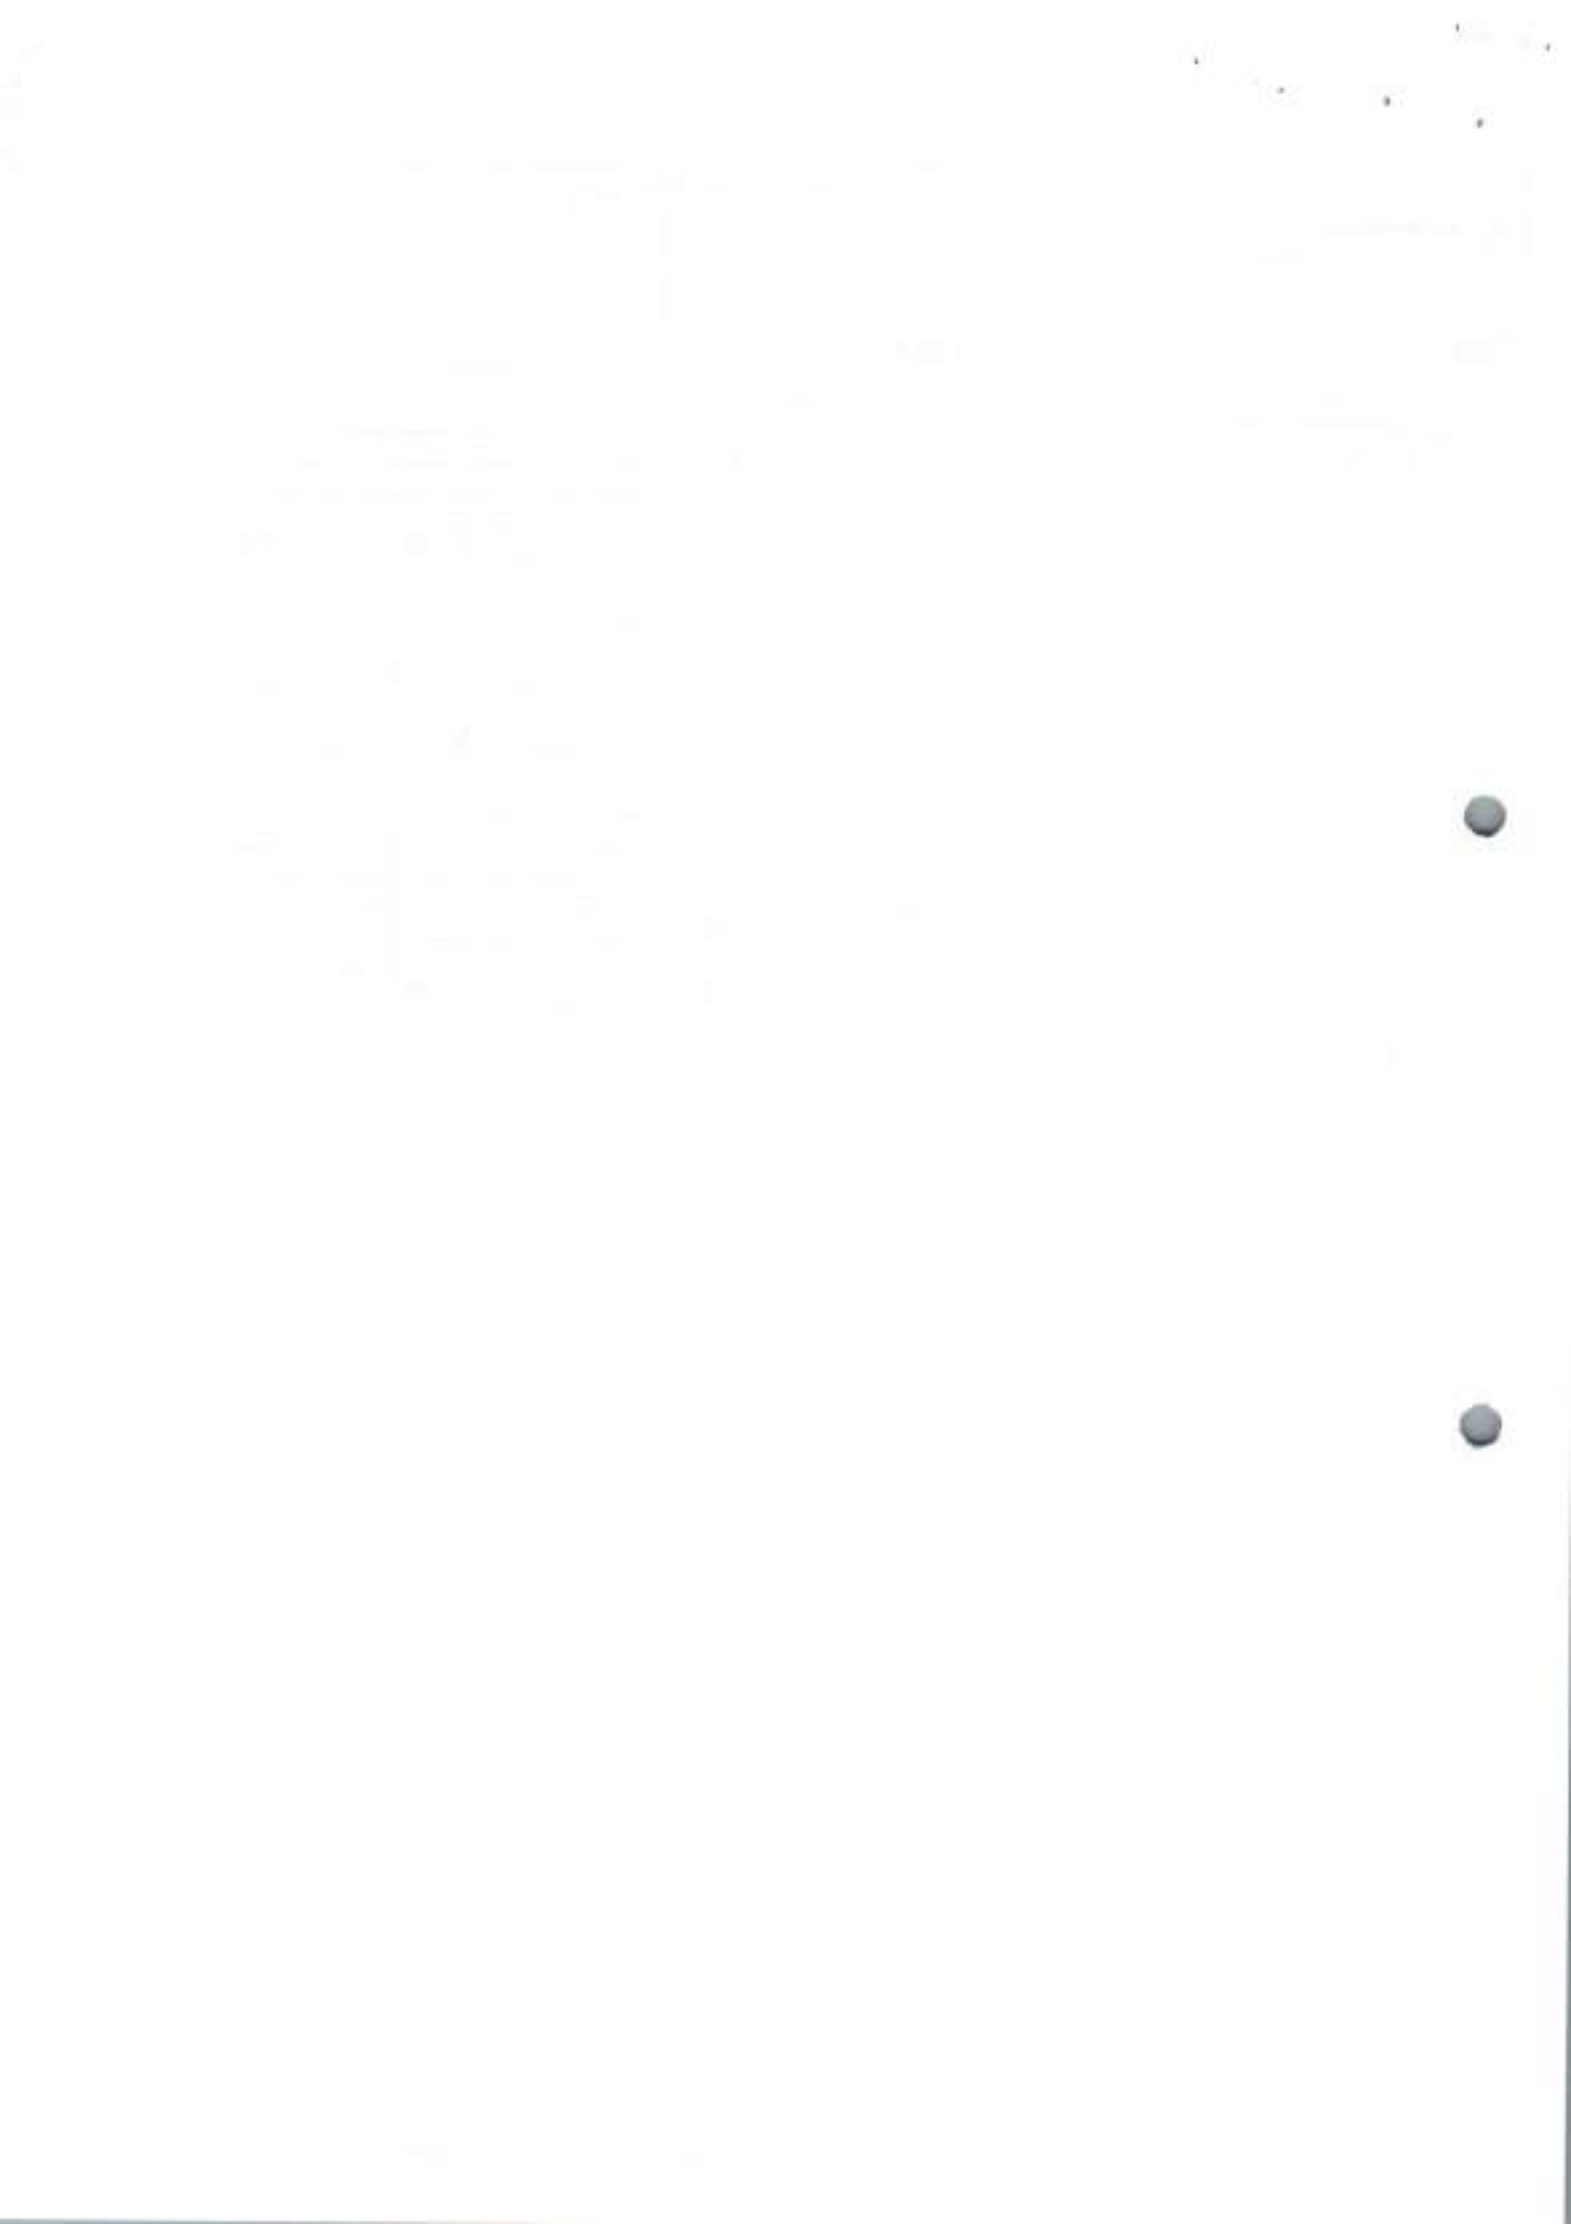

CREDENCIAMENTO PERMANENTE DE LICITADORES
 Nº. 1.763
 Rubens

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
ORA:	LIMPEZA DE SARGENTAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEO PISO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS	DATA:	19/05/2021
DESCRÇÃO:	LIMPEZA DE SARGENTAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEO PISO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS	FORTE:	VEREADOR
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS - PAULIÁ - CE.	EMPRESA:	DET. 1.001 DESEMPENHO COMPOSIÇÃO PROVISÓRIA
		HORA:	83,85%
		MES:	47,76%
		REF:	00000

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
A + B + C + D


ENOCH .F. Guimarães Jr
 Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4
 Consultor Técnico Ambiental
 Registro IBAMA 331652

